



IV Consejo de ESTADO REGIONAL

Decreto Supremo n.º 050-2021-PCM

Avances al 30 de setiembre de 2025

El Consejo de Estado Regional es una instancia operativa del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), donde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales convienen el desarrollo de acciones conjuntas en los territorios para la implementación de políticas, estrategias o intervenciones nacionales priorizadas en el marco del proceso de descentralización.

Lima, 16 y 17 de mayo de 2024

INFORMACIÓN GENERAL



Asistentes al IV CER



Ministros 16
Viceministros 19



Gobernador regional 23
Vicegobernador regional 2
Equipo técnico del gobierno regional 199



Equipo técnico del sector 338
Otros invitados 22

Total: 619

Reuniones técnicas bilaterales



Sector



Reuniones

MTC	18
MINSA	16
MIDAGRI	12
MINEDU	12
MININTER	11
MEF	11
MVCS	8
MTPE	6
MINEM	4
MINAM	3
MIMP	3
MIDIS	3
Multisectorial (VRAEM - Selva central)	2
MINCUL	2
PCM - ANIM	2
PRODUCE	2
MINCETUR	1
PCM - SGRD	1
PCM - SDOT	1
MINDEF	1
MINJUSDH	1
PCM - VGT	1

Total 121

Compromisos asumidos




7 Compromisos



5 Ejecutados



2 En proceso

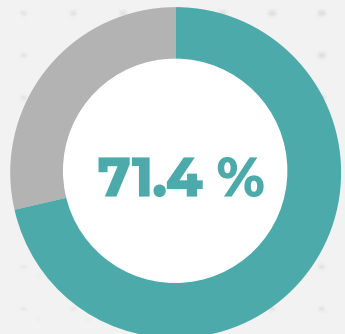


Avances de las mesas bilaterales




254* Acuerdos
*Más 12 acuerdos desestimado



228 Ejecutados

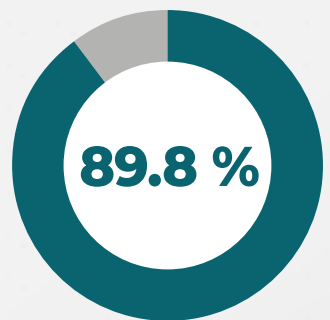


Avance de cumplimientos de acuerdos

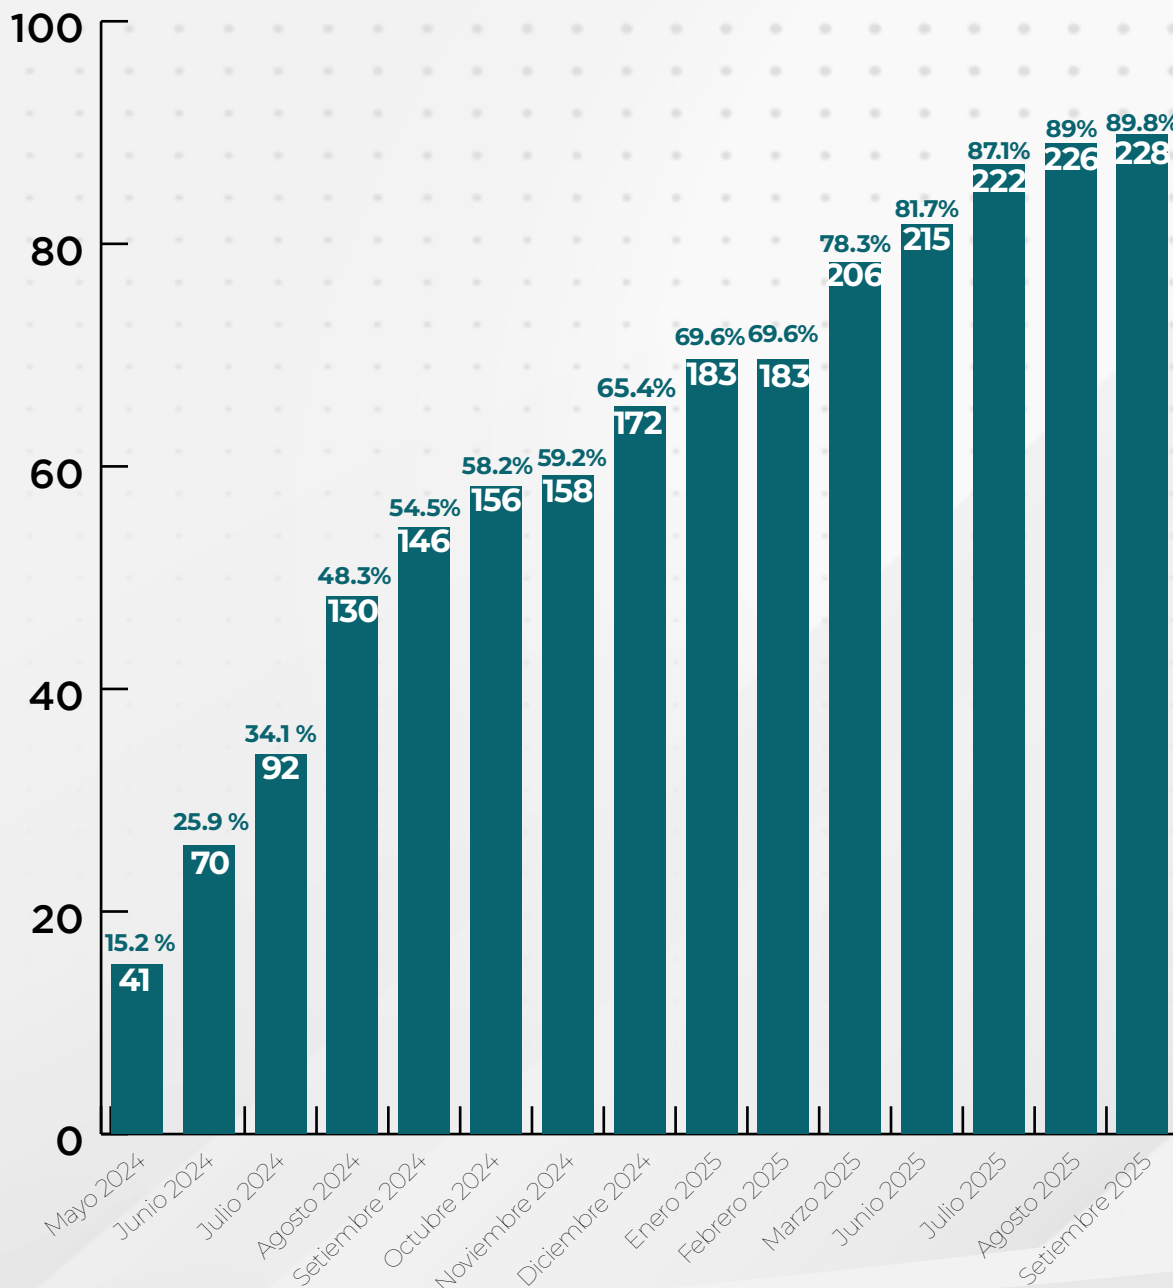


Acuerdos por sectores


	 N° de acuerdos	 Ejecutados	 Avance
MINEDU	29	29	100.0 %
MIDIS	10	10	100.0 %
MVCS	9	9	100.0 %
PCM	6	6	100.0 %
MINCUL	6	6	100.0 %
MINEM	5	5	100.0 %
MINAM	4	4	100.0 %
MIMP	3	3	100.0 %
PRODUCE	2	2	100.0 %
MINDEF	1	1	100.0 %
MTPE	14	13	92.9 %
MINSA	49	45	91.8 %
MIDAGRI	40	34	85.0 %
MININTER	18	15	83.3 %
MTC	57	46	80.7 %
MINJUSDH	1	-	-
TOTAL	254	228	89.8 %

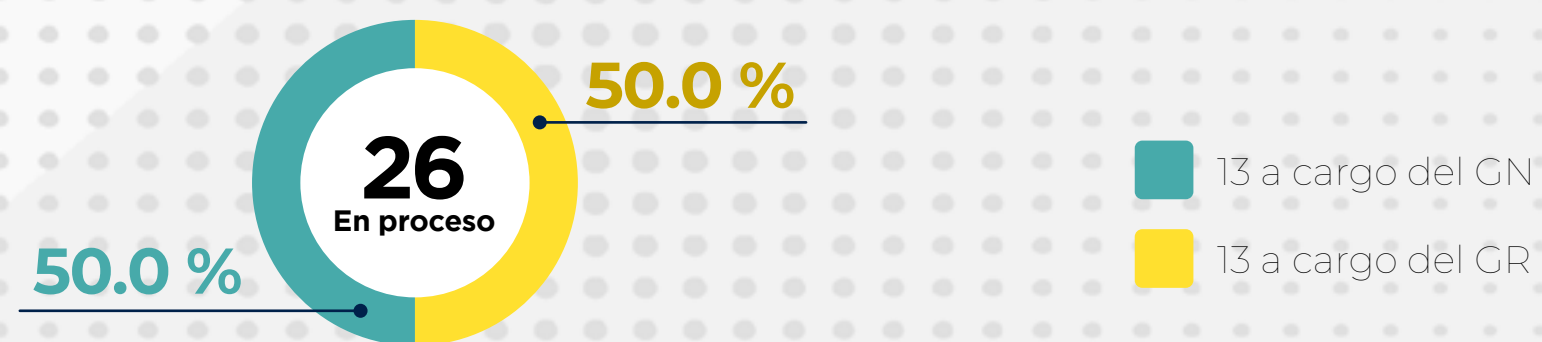


% de acuerdos ejecutados por nivel de gobierno

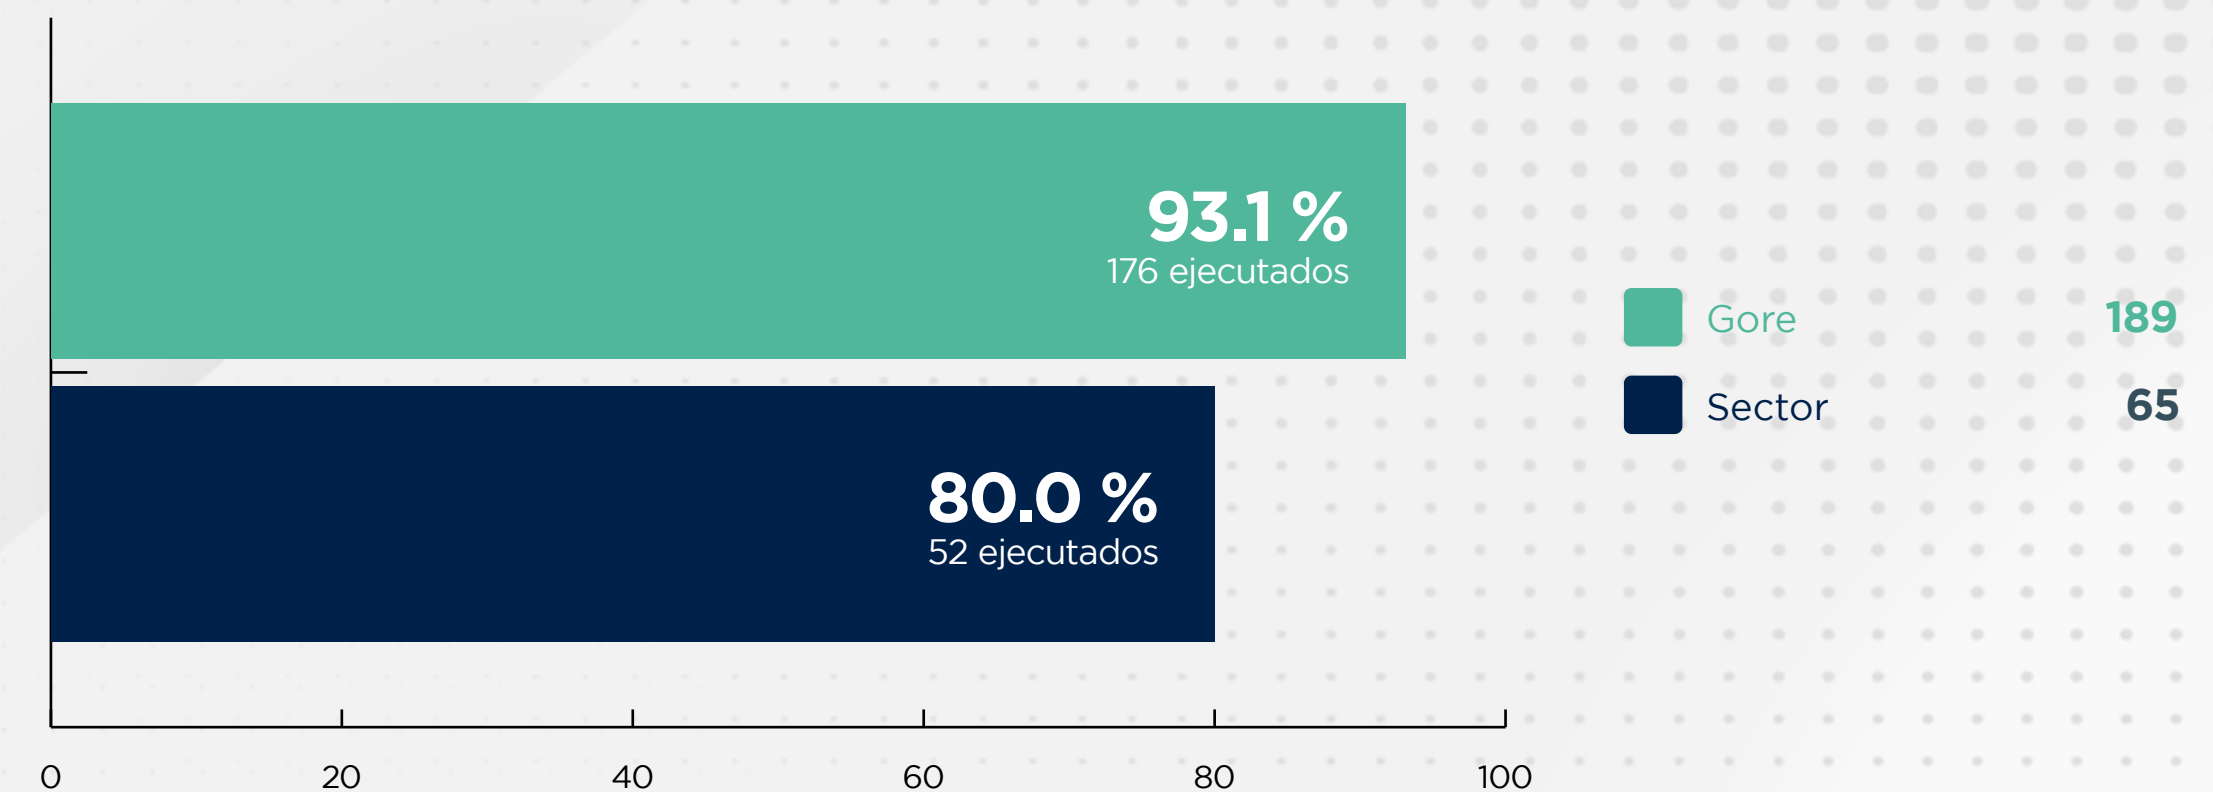


% de ejecución por tipos de acuerdos

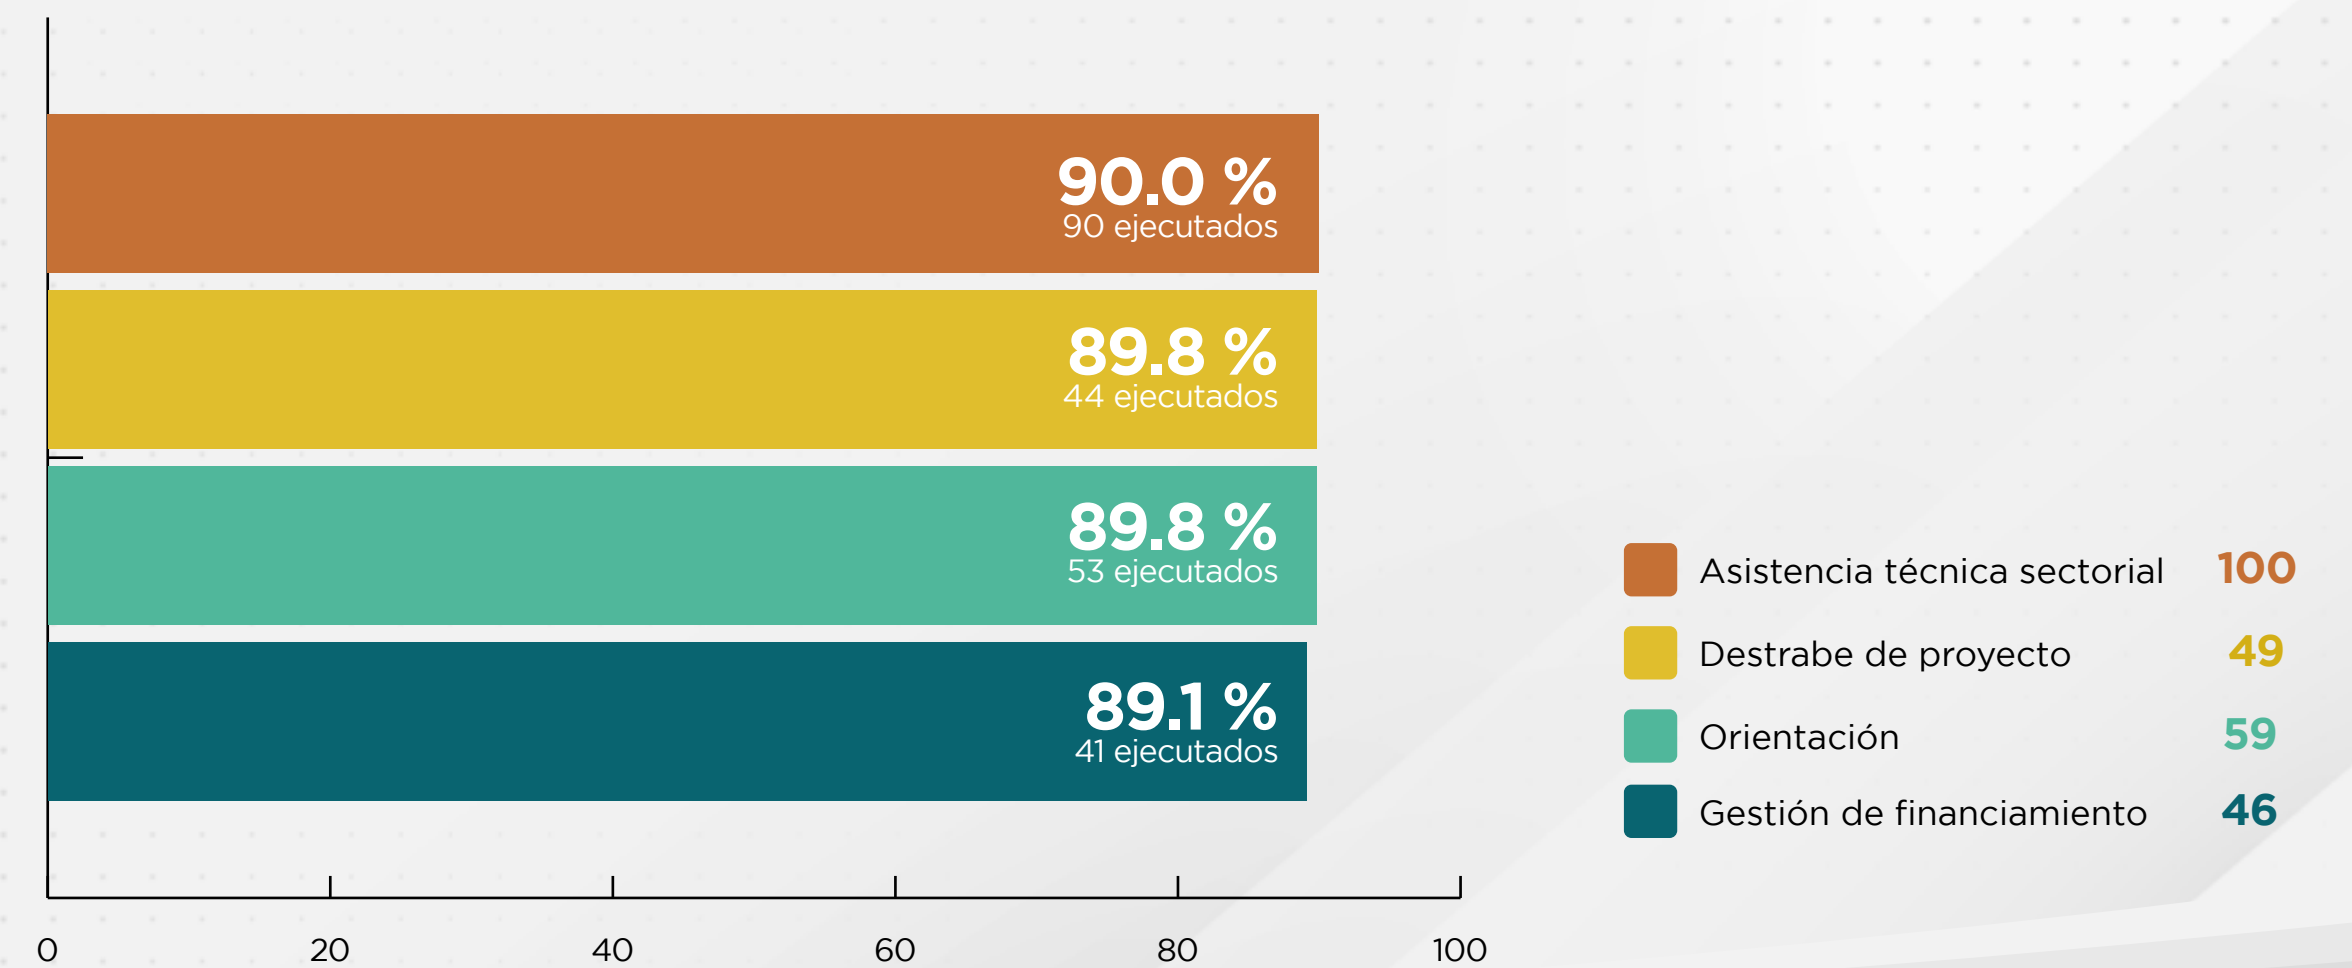

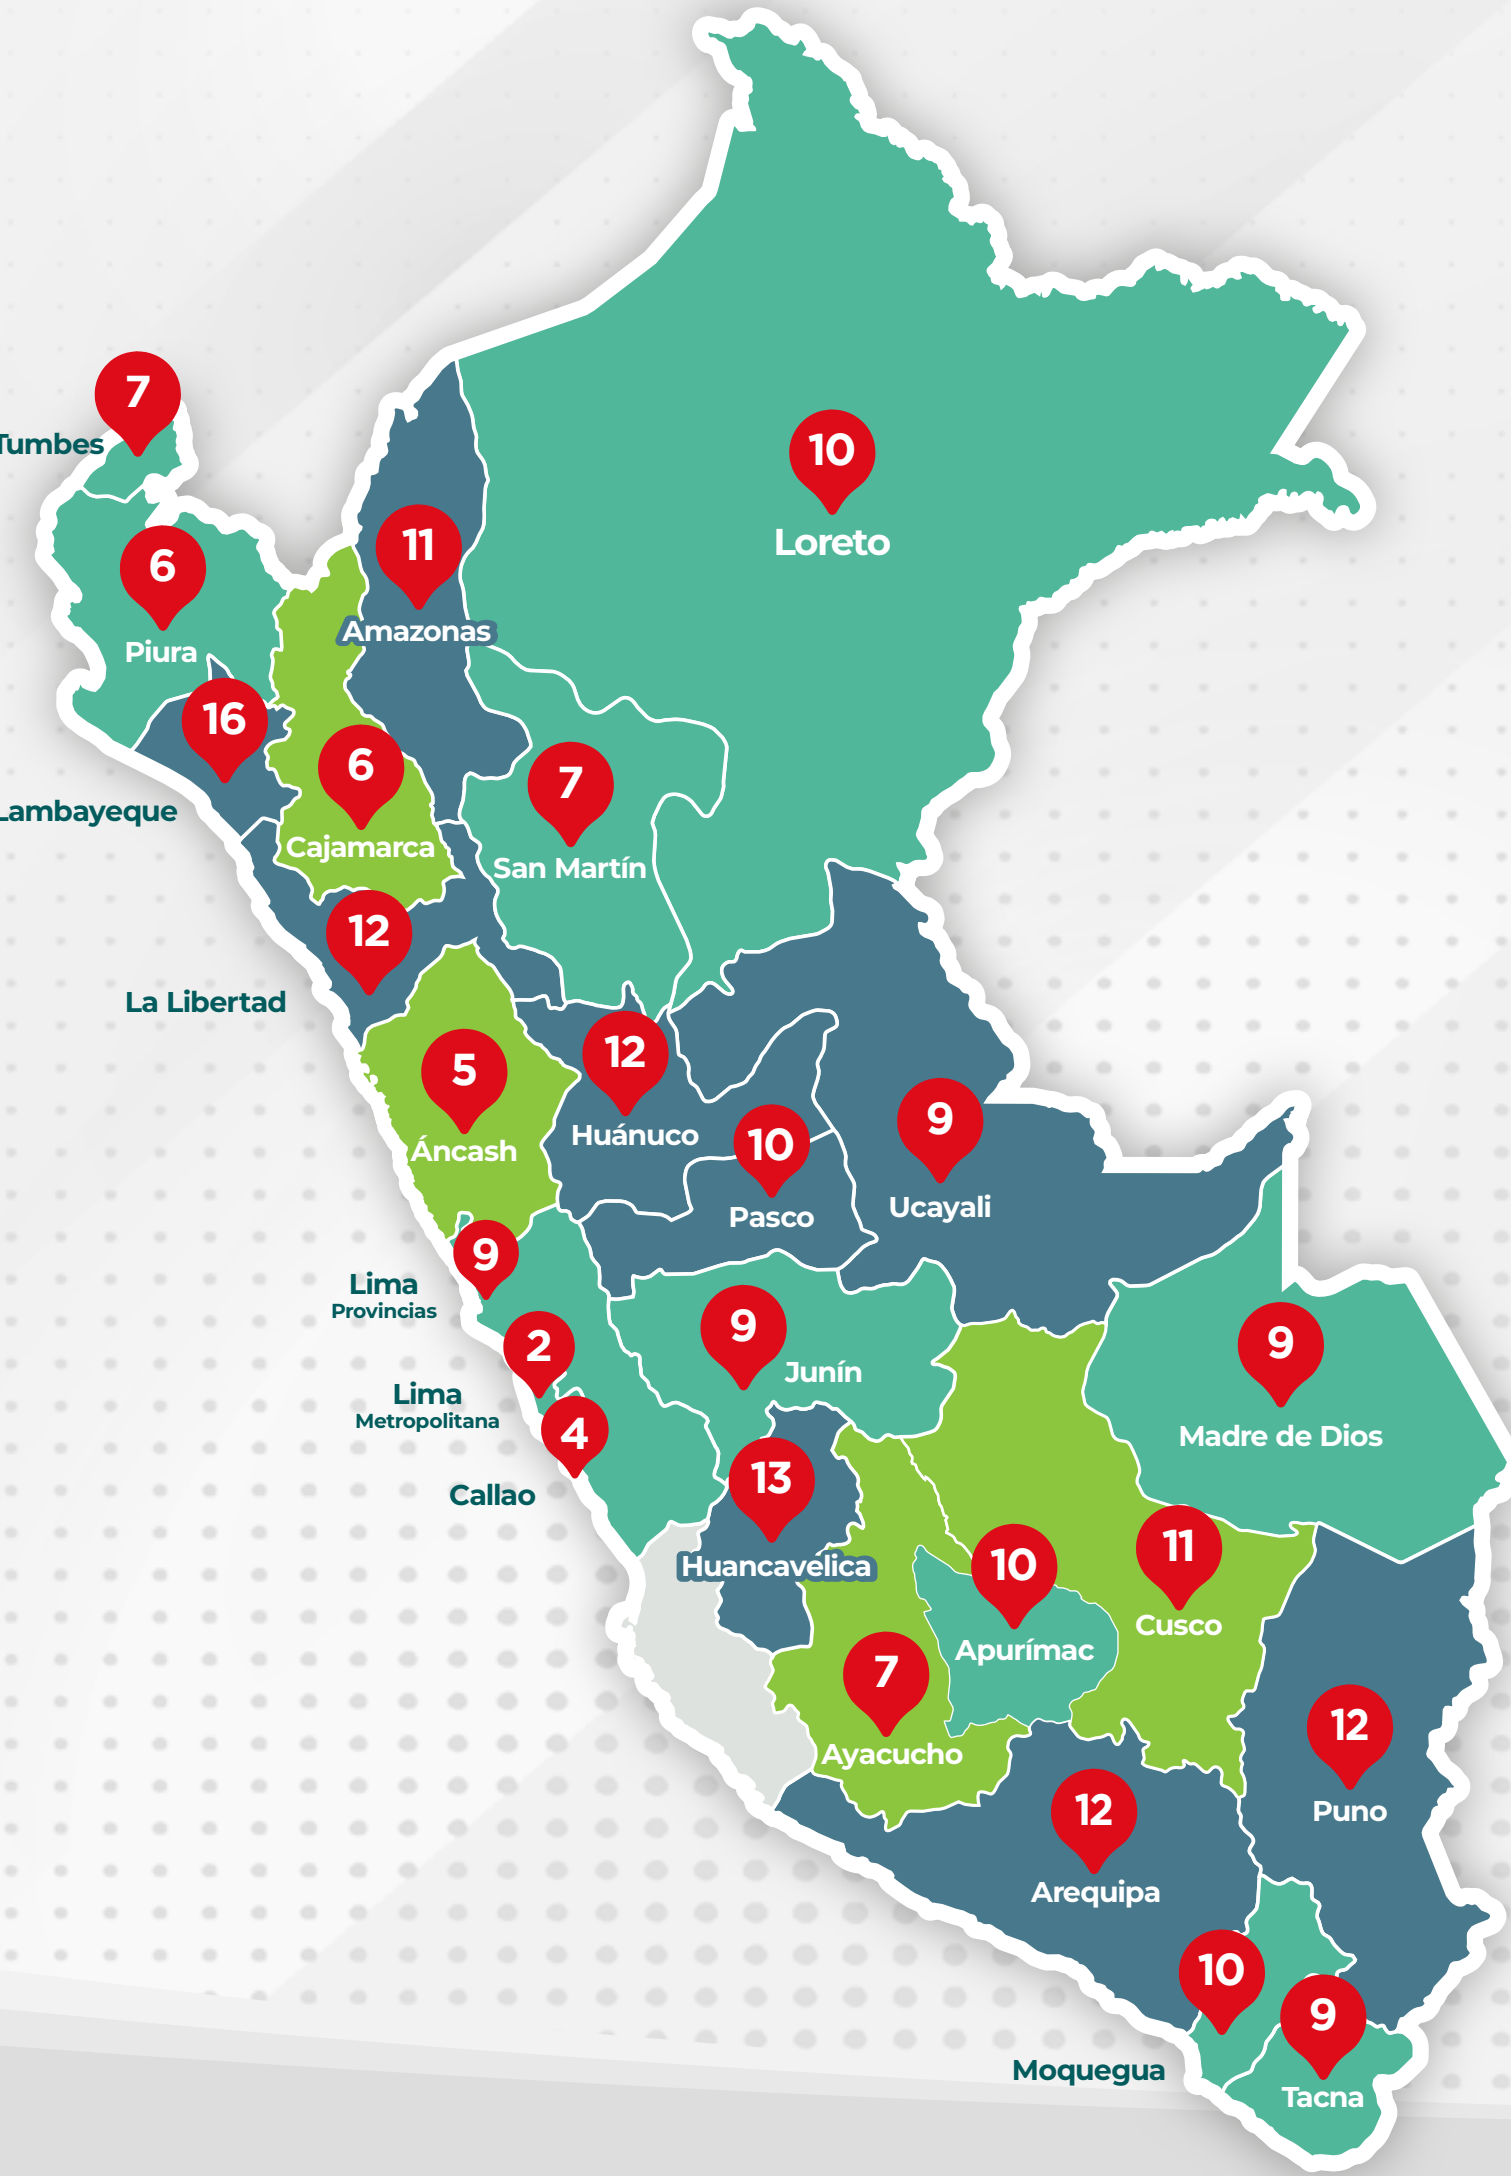


SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS


100 % de avance, 12 regiones

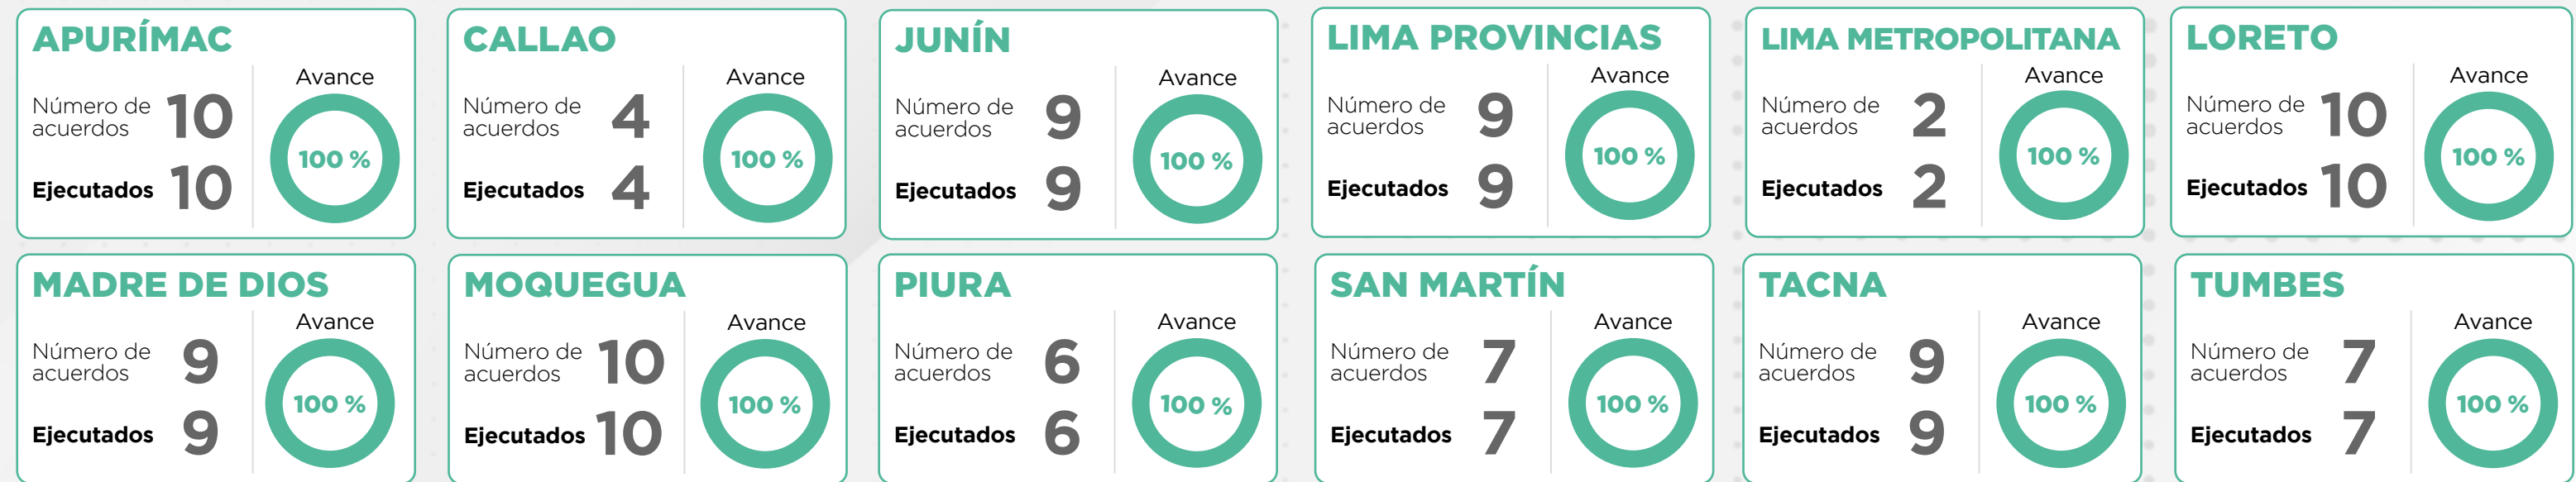

Mayor a 80 % y menor a 90 % de avance, 09 regiones

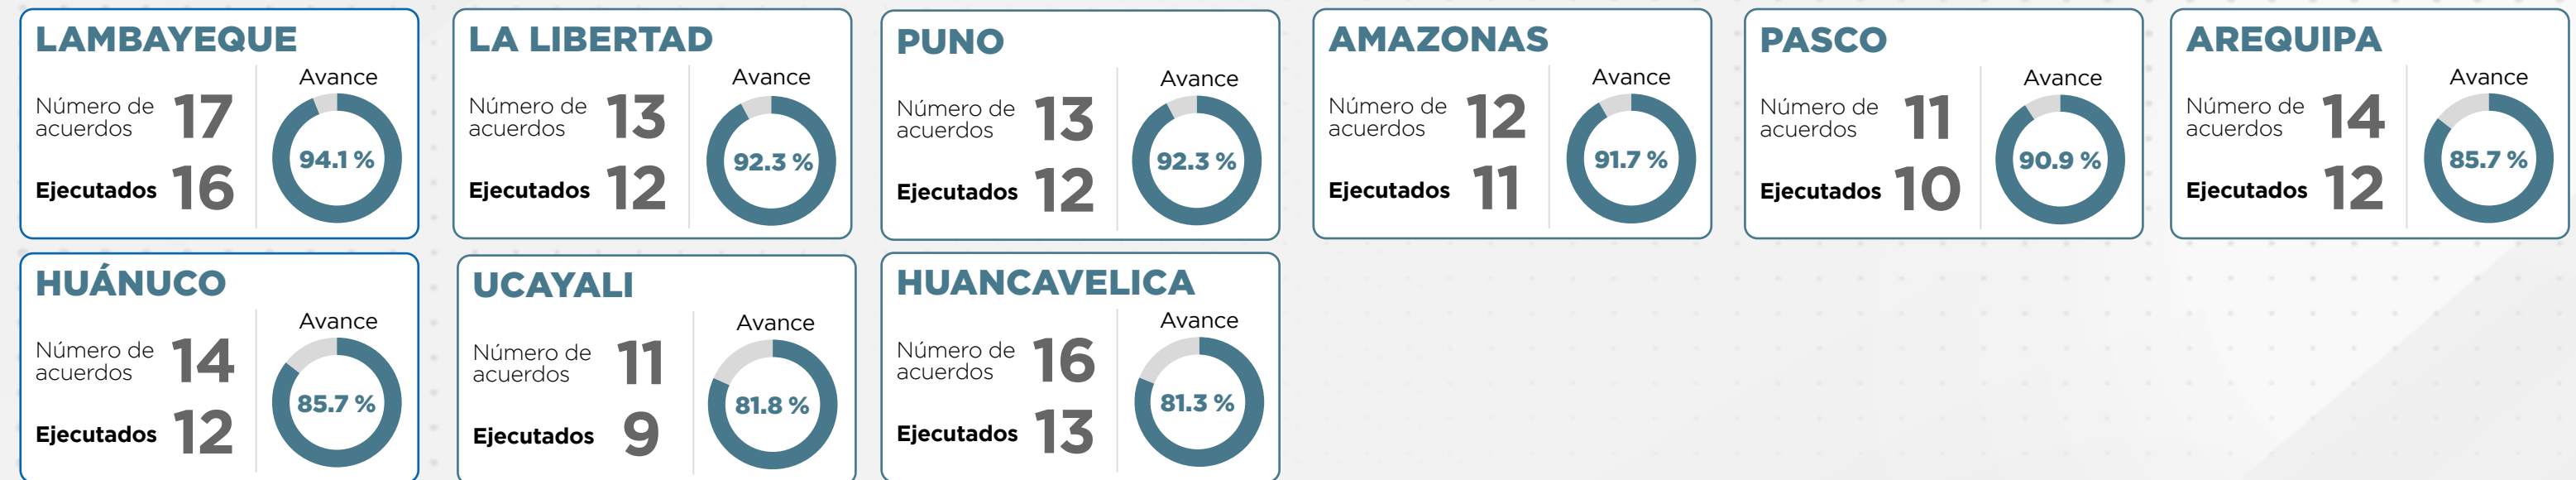

Mayor a 50 % y menor a 79 % de avance, 04 regiones

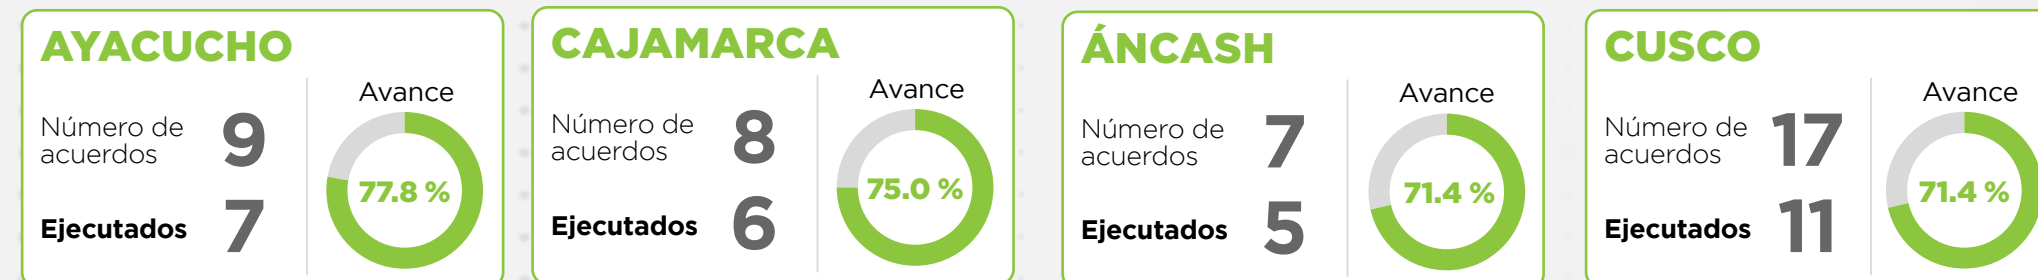

SEGUIMIENTO A LOS 7 COMPROMISOS



Ejecutado

Sector responsable: ANIN | Plazo: 2024

Compromiso:

Emitir una norma que habilite a que los proyectos, con un presupuesto por encima de los S/ 40 millones que estaban a cargo de la ARCC, pasen a cargo del ANIN. Aquellos proyectos que estén por debajo de los S/ 40 millones pasarán respectivamente a los gobiernos regionales y locales.

Avance reportado:

De acuerdo a la Nonagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley n.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se indica que las entidades de GN, GR y GL, podrán financiar y/o cofinanciar las intervenciones del PIRCC, con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Asimismo, podrán ejecutar de manera excepcional las IRI que al 06 de diciembre de 2023 hayan contado con el Formato Único de Reconstrucción (FUR) en el Banco de Inversiones del SNPMGI; y en caso contrario, serán evaluados por los sectores competentes. Esto va a permitir que las IRI puedan ser financiadas y ejecutadas sin que esto demande alguna norma adicional para tal fin.

Sin perjuicio de ello, la ANIN coordinó ante MEF el financiamiento de 209 IRI en el marco del num. 4.2 del art. 4 del DL 1659, y 11 IRI en el marco del art. 48 de la Ley 32103, que sin embargo a la fecha el MEF no ha atendido favorablemente.



Ejecutado

Sector responsable: MININTER | Plazo: 2024

Compromiso:

Financiar 23 proyectos de inversión en materia de seguridad ciudadana, en 13 departamentos del país: Ayacucho, Huancavelica, Cusco Lambayeque, Puno, Apurímac, Lima, Madre de Dios, Piura, San Martín, Ucayali, Arequipa y Junín.

Cumplimiento:

Mediante Resolución Ministerial n.º 0436-2024-IN se asignó 31.6 millones para la ejecución de 23 proyectos de inversión en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco Lambayeque, Puno, Apurímac, Lima, Madre de Dios, Piura, San Martín, Ucayali, Arequipa y Junín.



Ejecutado

Sector responsable: MEF | Plazo: 2024

Compromiso:

En el marco de la delegación de facultades legislativas, se otorgará las competencias a la SUNAT, a través de aduanas para el mejoramiento de la ampliación de los complejos fronterizos de todo el Perú.

Cumplimiento:

El Decreto Supremo n.º 289-2024-EF, de fecha 28/12/2024, modifica el numeral 4.2 del artículo 4, el epígrafe del título III, los artículos 6 y 7 del Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1183, Decreto Legislativo que aprueba la Ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera; adecuando a las modificaciones establecidas por el Decreto Legislativo n.º 1648.



Ejecutado

Sector responsable: MTC | Plazo: 2024

Compromiso:

Impulsar la conectividad regional en Cajamarca. Se realizará una visita técnica, a fines de mayo, al aeropuerto de Jaén para verificar el estado situacional de la pista de aterrizaje y determinar las acciones que conlleven a su operatividad.

Cumplimiento:

El MTC con fecha 03.06.2025, OTORGÓ LA BUENA PRO a la empresa CEMOSA para la elaboración de los expedientes técnicos de obra.

Actualmente, en el marco del RLCE, el proceso se encuentra en el consentimiento de la buena pro, le cual vence el 13/06/2025. Posterior a ello, y de no haber elevaciones, se continuaría con la etapa de perfeccionamiento del contrato el mismo que tiene un plazo de 8 días hábiles contados a partir del consentimiento de la Buena Pro.

Se estima la firma del contrato para el mes de julio 2025.



Ejecutado

Sector responsable: ANIN | Plazo: 2024

Compromiso:

Implementar una Mesa Técnica para el Desarrollo Territorial del departamento de Madre de Dios.

Cumplimiento:

A Setiembre:

Se cuenta con la acreditación de todos los integrantes de la mesa técnica (11 sectores, PCM, GORE Madre de Dios).

26/09/2024: instalación de la mesa técnica en la ciudad de Puerto Maldonado.

20/05/2025: Aprobación de la agenda de la mesa técnica, en reunión realizada en territorio.

Se tiene como resultado una cartera de 87 intervenciones, valorizada en S/ 1 700 millones (84 proyectos y 03 actividades). Se destaca que se cuenta con 05 proyectos aptos valorizados en S/ 8,9 millones (02 proyectos de saneamiento por S/ 5,3 millones, del distritos de Las Piedras y Manu; y 03 proyectos en el marco del Programa Llamkasun, por S/ 3,6 millones; del distrito Las Piedras).

Financiamiento de 03 proyectos de agua potable: CP Lucerna S/ 943 mil y CP Bello Horizonte S/ 544,409 ambos en el distrito Las Piedras, y de 01 proyecto de agua potable en Nuevo Iñapari S/ 10 millones (MP Iñapari).

Las unidades ejecutoras se encuentran en proceso de subsanar las observaciones identificadas en reuniones de seguimiento y asistencia técnica realizadas con los diferentes sectores del Ejecutivo, a efectos de continuar con la gestión de las referidas inversiones.

SEGUIMIENTO A LOS 7 COMPROMISOS



Sector responsable: MINEDU | Plazo: 2024

Compromiso:
Inaugurar los COAR Tacna, Áncash y Moquegua que beneficiarán a 900 estudiantes con mejores condiciones académicas. Implementar 51 instituciones educativas públicas, a través de modalidad de APP, en las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali, Tumbes, Cusco, Pasco, Huancavelica y Lima. Ello en beneficio de mil estudiantes por un monto de inversión aproximado de S/ 13 mil millones.

Avance reportado:
Inauguración y entrega de los COAR Ancash, Tacna y Moquegua.

COAR Ancash, el 21/03/2025 se inauguro por parte del Gobernador Regional, el COAR Tacna se inauguró el 31/01/2025 por la SPR y COAR Moquegua se inauguró el 19/02/2025 por la SPR.

Implementación de 51 instituciones educativas a través de APP

COAR Centro: A febrero 2025 se contaba con los 3 EDI aprobados (Cusco en Feb24, Huancavelica en Oct24 y Pasco en Feb25). En fecha 18/08/2025 el concesionario presentó el expediente del cierre financiero para revisión de PROINVERSION, teniendo hasta el 17/09/2025 para su conformidad, con ello tendríamos previsto firmar el acta de inicio de obras entre el 18/09/2025 y 27/09/2025. En caso se rechace el cierre financiero, el MINEDU invocaría la terminación del contrato por incumplimiento del Concesionario, teniendo 30 días calendario para levantar el incumplimiento de acreditación de cierre financiero, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

IPC CER Lima Metropolitana: El 25/07/2025, la CGR emitió a PROINVERSION la opinión a la Version Inicial del Contrato (VIC). PROINVERSION se encuentra en proceso de elaborar respuesta a la CGR y realizar los últimos ajustes a la VIC, previa opinión favorable del MINEDU, con ello entre setiembre y octubre del año en curso, se esperaría aprobar y publicar la Declaratoria de Interés (DI).

IPC ATE - SJL/ IPC SMP-COMAS: En cuanto a las gestiones a los PRT (Punto de referencia tecnico), se encuentra pendiente que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emita el Acuerdo de Consejo Municipal para el predio destinado al PRT de la IE n.º 146 "Su Santidad Juan Pablo II". Asimismo, continúa pendiente la respuesta respecto al apoyo solicitado para la nivelación y limpieza del terreno destinado al espacio deportivo del PRT PEIP - Juan Velasco Alvarado.

Respecto a la IPC CER SMP-COMAS, a la fecha DIPLAN emite revisión con observaciones a la actualización de cambios técnicos. Así mismo, el 15/08/2025 mediante Oficio 01480-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE el Pronied traslada el Levantamiento de observaciones emitida por la DIGEBR, el cual se encuentra proceso de revisión por el DIPLAN. Respecto a las gestiones PRT , la UGEL 02 y UGEL 04, se encuentra pendiente que la remitan las RD que aseguren los predios identificados para implementar el Plan de Reubicación Temporal.

IPC Colegios Cusco: Se atendieron diversos pedidos de PROINVERSIÓN, te tuvo reuniones presenciales con el equipo de PROINVERSIÓN y PRONIED, a fin de coordinar los aspectos técnicos de la VIC de IPC Colegios Cusco.

COAR Tumbes: Pendiente que PRONIED como Unidad Ejecutora complete opinión favorable al proyecto de Convenio entre el GORE Tumbes y MINEDU para el diseño, financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento del COAR Tumbes, a fin de levantar las observaciones y requerimientos de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Siguiente



COAR Madre de Dios: Mediante Oficio 1525-2025-MINEDU/VMGI-DIGEIE se reitera efectuar las acciones del levantamiento topográfico por parte del GORE, a fin que el MINEDU pueda iniciar el proceso de saneamiento físico legal. Asimismo, se revisó el SINABIP Web y la Partida Registral n.º 11012039 del Registro de Predios de Madre de Dios advirtiéndose que la afectación en uso otorgada por la SBN para el desarrollo del COAR a la fecha se encuentra todavía vigente

Sector responsable: MINEM | Plazo: 2024

Compromiso:
Impulsar la inversión privada de la planta de hidrógeno verde en Arequipa, la cual permitirá reactivar la economía de tan importante zona.

Avance reportado:
Se concluyó con la propuesta del Reglamento de la Ley de Fomento de Hidrógeno Verde (PDS H2V), su exposición de motivos y el informe técnico que lo sustenta, el cual ha sido actualizado con los comentarios de las Direcciones Generales, el mismo que fue remitido mediante Memo-00603-2025/MINEM-DGEE a la Oficina de Asesoría Jurídica (OGAJ) a fin que, continúe con la pre - publicación para recibir comentarios y aportes de la ciudadanía en general. Cabe señalar que este dispositivo normativo, se pre publicará en el diario oficial El Peruano y se articulará y socializará con los sectores involucrados.

Paralelamente en coordinación con OGAJ y la asistencia de la Secretaría de Gestión Pública de (SGP) de PCM, se está trabajando el expediente AIR Ex Ante.

Así también, se ha elaborado el documento "Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde"; así como la formulación de su Exposición de Motivos e Informe Técnico de sustento, el cual se encuentra en revisión final.

CONCLUSIONES

Se realizó el seguimiento y monitoreo de los avances del **IV CER al 30 de setiembre de 2025**, en coordinación con los ministerios y gobiernos regionales, teniéndose las siguientes conclusiones:



Se ha **ejecutado 02 de 07 compromisos representando el 71.4%**, asumidos en el IV Consejo de Estado Regional.



Se ha cumplido **228 acuerdos** de 255, representado el **89.8%** de acuerdos asumidos. Se resalta el avance del **MINEDU, MIDIS, MIMP, MINAM, MINCUL, PCM, MINDEF, MINEM, MVCS, PCM y PRODUCE**, sectores que han **cumplido el 100 % de acuerdos asumidos**, seguido del **MINSA (89.8), MTPE (86.7%), MIDAGRI (85%), MININTER (83.3%), MTC (80.7%) y MINJUSDH** que aun no registra avance.



Los departamentos de **Apurímac, Callao, Junín, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes** lograron un avance de **100 % en la ejecución de acuerdos**, seguidos del departamento de **Lambayeque (94.1%), La Libertad (92.3%), Puno (92.3%) Amazonas (91.7%), Pasco (90.9%), Huánuco (85.7%), Ucayali (81.8%), Huancavelica (81.3%), , Arequipa (78.6%), Ayacucho (77.8%), Cajamarca (75.0%) Áncash (71.4%), Lima Metropolitana (66.7%), y Cusco (64.7%).**

El cumplimiento de acuerdos del IV CER, ha contribuido a:



Contrato suscrito para ejecución de saldo de obra (08/05/25) Remodelación de sendero; adquisición de señalización turística de interpretación; en el(la) plaza de armas de la ciudad de Pucallpa distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali (CUI 2637119) El 23/07/2024 se dio inicio a la ejecución de las obras en la Plaza de Armas de Pucallpa, contrato suscrito en fecha 10/07/2024 por el monto de S/ 2,1 millones. El PIM asignado para el año 2025 es de 3.8 millones de soles, el monto de inversión actualizado es de 4.5 millones de soles. **El avance de la ejecución física es de 30% a septiembre el 2025.**



Suscripción del contrato para la elaboración del ET del saldo de obra del proyecto (24/09/2024): Creación, mejoramiento del sistema de agua potable, sistema de saneamiento mixto de las comunidades del distrito de Nieva – Condorcanqui - Amazonas. (CUI 2345794). Con fecha 24/09/2024 se suscribió el contrato. El PIM asignado para el año 2025 es de 0.2 millones de soles, el monto de inversión actualizado es de 24.4 millones de soles. **Avance de la ejecución física de la obra de 70.1%. A la fecha el ET se encuentra en elaboración.**



Inicio de la ejecución de obra (20/08/2024), remodelación del malecón turístico de Pucallpa (CUI 2637136) El 04/09/2024 se dio inicio a la ejecución de la obra. Contrato suscrito en fecha 20/08/2024 por el monto de S/1,990,702. El PIM asignado para el año 2025 es de 1.7 millones de soles, el monto de inversión actualizado es de 3.4 millones de soles. **A septiembre el avance de la ejecución física de la obra de 80.27%.**



Reinicio de ejecución de obra del proyecto (21/02/2024): Instalación del sistema de riego Quisco - distrito de Alto Pichigua - provincia Espinar – Cusco (CUI: 2156206) Con un monto de inversión de 162,8 millones de soles y un PIM de 17.1 millones e soles. **Con un avance en la ejecución física de 42.6% al 09/09/25.**



Reinicio de obra (03/03/2025): Mejoramiento de los servicios básicos del nivel secundario en la I.E Demetrio Templadera Martínez, centro poblado San Antonio de Sunec del distrito de Ticlacayan - provincia de Pasco - departamento de Pasco (CUI 2565257). El PIM asignado para el año 2025 es de 5.8 millones de soles, el monto de inversión actualizado es de 13.8 millones de soles se tiene un registro de avance de ejecución física de 41.9% a septiembre.

CONCLUSIONES



Aprobación del Expediente Técnico (06/02/2025): Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cruz Conga en los distritos de Huasmin, Celendín, José Gálvez, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca (CUI 2289170). Mediante RJ n.º 18-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UIR. El PIM asignado para el año 2025 es de 3.8 millones de soles, el monto de inversión actualizado es de 39.9 millones de soles. **A la fecha se viene gestionando demanda adicional – proyecto Apto.**



Inicio elaboración de Expediente Técnico (22/01/25): Mejoramiento y construcción de la carretera EMP PIN - Olmos - EMP.1NJ y desvío nueva ciudad de Olmos- Nueva Ciudad de Olmos - EMP. LA510 y desvío Morrope - EMP.LA105 (Morrope), distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque (CUI 2329189) se suscribió el contrato para elaboración de ET por 4.9 millones de soles, con plazo de ejecución de 345 dc. **El PIM asignado para el año 2025 es de 1.4 millones de soles, el monto de inversión actualizado es de 685.4 millones de soles.**



Reinicio de ejecución de obra del proyecto (14/05/2025): Construcción de sala de Hemodiálisis; adquisición de máquina de hemodiálisis, sillón para hemodonacion y coche de paro equipado; además de otros activos en el(la) EESS hospital Tarapoto - Tarapoto en la localidad Tarapoto, distrito de Tarapoto, provincia San Martín, departamento San Martín (CUI: 2558700) Con un monto de inversión de 12.7 millones de soles y un PIM de 4 millones de soles. **Con un avance en la ejecución física de obra de 98% al 11/09/25.**



Suscripción del contrato para la elaboración del ET (22/01/25): Mejoramiento y construcción de la carretera EMP PIN - Olmos - Emp.1nj y desvío nueva ciudad de Olmos- nueva ciudad de Olmos - EMP. LA510 y desvío Morrope - EMP.LA105 (Morrope), distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque (2329189). Con un monto de inversión de 685.4 millones de soles y un PIM de 1.4 4 millones de soles y un plazo de 16 meses.



Reinicio de ejecución de obra (21/02/25): Mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica; distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica (CUI: 2354781). Con fecha 20/12/24 se suscribió el convenio de administración de recursos mediante R.M. N°892-2024 / MINSA. Con fecha 21/02/25 se suscribió el contrato para la ejecución de saldo del saldo de obra. Con un monto de inversión de 514.9 millones de soles y un PIM de 65 millones de soles. **El día 19/09/25 se inició la ejecución de obra. Se registra un avance de ejecución física de 31.5%.**



Inicio de ejecución de obra (24/04/25): Mejoramiento del servicio educativo en el instituto de educación superior tecnológico público Enrique López Albújar distrito Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento Lambayeque (CUI: 2156206). Con un monto de inversión de 105.4 millones de soles y un PIM de 30 millones de soles. **Con un avance en la ejecución física de 31.5% al 10.09.25.**



Suscripción del contrato (07/04/25) para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio - Valle de Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro - Moquegua y la provincia de Islay –Arequipa CUI: 2487020. Monto de inversión de 462.6 millones de soles, PIM 2025 de 7.4 millones de soles. con un plazo de 105 días calendario.

RECOMENDACIONES



La Secretaría de Descentralización socializará el esquema y los resultados del seguimiento y monitoreo de los acuerdos del Consejo de Estado Regional a los territorios.



Los **gobiernos regionales** deberán designar de manera permanente un **punto focal** para articular el seguimiento.



Realizar **reuniones de seguimiento permanente** con el punto focal de los GOREs y equipo técnico de los sectores. La Secretaría de Descentralización propiciará el destrabe y cumplimiento de compromisos y acuerdos.



Difundir los resultados del seguimiento y monitoreo de los compromisos y acuerdos del Consejo de Estado Regional.



Realizar seguimiento a la cartera priorizada en el Consejo de Estado Regional, en coordinación con los Sectores y Gobiernos Regionales.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MTC




Asignación de recursos para:
Mejoramiento del ferrocarril
Huancayo – Huancavelica.
CUI: 2397504

N.º Acuerdo - CER IV- 00321

Se llevó a cabo la adjudicación del FHH el 28/08/24. Con fecha 28/05/25 se firmo el contrato de concesión. Asimismo, el sector mediante la Dirección de Disponibilidad de Predios ha iniciado tempranamente con la liberación de áreas (predios e interferencias).

PROINVERSIÓN entrega a autoridades de Huancavelica contrato de concesión del Tren Macho, el 03/06/2025.



Meta física: 128.2 km

UEI: Dirección de Inversión Privada de Transportes (DIPT - MTC)



Suscripción del contrato para la ejecución
“Rehabilitación y mejoramiento de la
carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) -
Chaglla – Rumichaca”, Tramo: Pte. Rancho -
Panao - CUI: 2234986

N.º Acuerdo - CER IV-00245

Al 17/03/25 se otorgo la buena pro a la LP-SM-7-2024-MTC/20-1, por un monto de 579.8 millones de soles. El 23/04/25 se firmó el contrato n.º 037-2025-MTC/20.2



UEI: PVN-MTC

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MTC



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Adjudicación de obra del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del circuito Bicentenario de la Independencia en 5 distritos de la provincia de Huaura - departamento de Lima - CUI 2482109

N.º Acuerdo: CER II – 058

Se otorgo la Buena Pro de ejecutor de obra con fecha 20/05/25.
Con fecha 11/06/2025, se ha suscrito el contrato para el ejecutor de obra, así como el de la supervisión.



PIM 2025:

S/ 50.9 millones



Monto de inversión:

S/ 122.9 millones



Familias beneficiadas:

70 737 habitantes

Unidad Ejecutora: GORE Lima.



MINEDU



Gobierno Regional Madre de Dios

Culminación de obra mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E.B.R. n.º 52183 Rompeolas, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios centro poblado de Rompeolas - distrito de Tambopata - Madre de Dios - CUI: 2358375

N.º Acuerdo - CER IV-00054

Se culmino la obra con fecha 03/06/2025 con un avance físico de 99.4% a septiembre.



Monto de inversión:

S/ 25.4 millones



PIM 2025:

S/ 1.6 millones



Familias beneficiadas:

401 habitantes

Unidad Ejecutora: GORE Madre de Dios.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINEDU



Inicio de ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios educativos del Instituto Superior Pedagógico Público Fray Ángel J. Azagra Murillo, distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa - departamento de Pasco - CUI: 2566705

N.º Acuerdo - CER IV-0340

Con fecha 24/01/25, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra por un monto de 19.6 millones de soles. **A septiembre se ha dado inicio a la ejecución de obra y se tiene un avance físico de 6.2 y financiero de 11.5%**



Unidad Ejecutora: GORE Pasco



Firma de contrato para ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación de servicios educativos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Alexander Von Humboldt, distrito Villa Rica, provincia Oxapampa, región Pasco- CUI 2234845

N.º Acuerdo - CER IV – 341

Con fecha 27/12/24 se suscribió contrato para ejecución por un monto de 43.7 millones de soles. **Se inicio la ejecución de obra el 19/03/2025. A septiembre se tiene un avance físico del 0.1%.**



Unidad Ejecutora: GORE Pasco

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINSA



Suscripción de contrato para la adquisición de ambulancia rural; en nueve Establecimientos de Salud I.4, Establecimientos de Salud I.2, Establecimientos de Salud I.3, Establecimientos de Salud I.1 a nivel provincial (Pasco - Pasco) - CUI 2597984

N.º Acuerdo - CER IV-00238

IOARR, en ejecución de gasto financiero con avance de 99%. **Se suscribió el contrato para la adquisición de ambulancias a través de UNOPS.**



Unidad Ejecutora: MINSA - OGA.



Se otorgo la Buena Pro para la ejecución del mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Tapuc, distrito de Tapuc - provincia de Daniel Alcides Carrión - departamento de Pasco - CUI 2489123

N.º Acuerdo - CER III – 051

Se otorgó la Buena Pro de ejecutor de obra el 22/08/2025, A la fecha en proceso de firma de contrato e inicio de obra.



Unidad Ejecutora: Gobierno regional Pasco.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINSA



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Inicio de ejecución de obra: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital de Ferreñafe distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque - CUI 2310820

N.º Acuerdo - CER IV - 229

Se otorgo la buena pro el 05/03/25, pendiente firma de contrato por un monto de 174,8 millones de soles.

Con fecha 19/03/2025 se suscribió el contrato para la supervisión de obra y el 06/05/25 de inicio la ejecución de obra. A septiembre registra un avance de 0.9%



Unidad Ejecutora: GORE Lambayeque.



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

Adjudicación para la ejecución del proyecto: Mejoramiento de la capacidad diagnostica y resolutiva de los servicios de atención de la salud del Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Apurímac - CUI 2234314

N.º Acuerdo - CER II - 152

Con fecha El 14/02/25 el comité culminó con la evaluación de las ofertas de los consorcios, adjudicando el proyecto al Consorcio UKHA (Reino Unido), por un monto de 815.5 millones de soles.

Al 30/06/25 En conformación de PMO y elaboración del modelo del contrato para la Procura Internacional.



Unidad Ejecutora: PRONIS - MINSA

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MIDAGRI



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Convocatoria de obra del proyecto: Mejoramiento de la eficiencia del sistema hidráulico de conducción y distribución Pampagrande - distrito de Chongoyape - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque - CUI 2360385

N.º Acuerdo - CER II - 110

En proceso de convocatoria buena pro 16/06/25 consentimiento: 26/06/25 firma de contrato: 10/07/25 inicio de obra julio. Supervisión: en proceso de convocatoria buena pro 13/06/25 consentimiento 26.06.25 firma de contrato 04/07/25.



PIM 2025:

S/ 22.7 millones



Monto de inversión:

S/ 64.6 millones



Familias beneficiadas:

4250 habitantes

Unidad Ejecutora: Proyecto especial Olmos Tinajones



Adjudicación de obra: Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de construcción de la represa de Iruro. CUI 2151332

N.º Acuerdo - CER IV - 125

El 04/02/25 se otorgó la buena pro la ejecución del saldo de obra del proyecto Iruro, sin embargo no se logro la firma de contrato, se firmo contrato con el 2do postor el 16/04/25 por un monto de 191 millones de soles.

Con fecha 16/05/25 se firmo el contrato para la supervisión de obra. Obra en ejecución con un avance físico de 14.8% a septiembre



PIM 2025:

S/ 65.5 millones



Monto de inversión:

S/ 287.7 millones



Familias beneficiadas:

13 325 habitantes

Unidad Ejecutora: PSI-MIDAGRI
