



VI Consejo de **ESTADO** **REGIONAL**

Decreto Supremo n.º 050-2021-PCM

Avances al 30 de setiembre de 2025

El Consejo de Estado Regional es una instancia operativa del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), donde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales convienen el desarrollo de acciones conjuntas en los territorios para la implementación de políticas, estrategias o intervenciones nacionales priorizadas en el marco del proceso de descentralización.

Piura, 11 y 12 de diciembre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL



15
Sectores



8
Compromisos



229
Acuerdos



105
Reuniones técnicas
bilaterales



419
Asistentes

Asistentes al VI CER



Ministros
Viceministros/as

10
11



Gobernador(a) regional
Vicegobernador(a) regional
Equipo técnico del gobierno regional

19
1
146



Equipo técnico del sector

232

TOTAL 419

Reuniones técnicas bilaterales



Sector



Reuniones

MTC	16
MINSA	16
MVCS	12
MIDAGRI	10
MINEDU	9
PCM - ANIN	9
PRODUCE	6
MEF-PROINVERSIÓN	5
MINDEF	4
MININTER	4
MIMP	4
MINCETUR	4
CULTURA	2
MTPE	2
MINJUSDH	2

TOTAL 105

Compromisos asumidos




8

Compromisos




7

Compromisos
ejecutados



1

Compromisos
en proceso

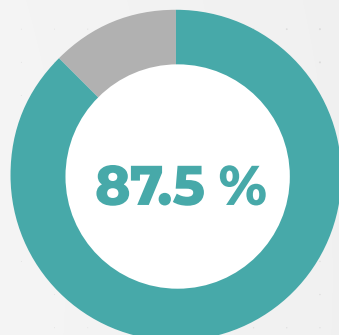

Avances de las mesas bilaterales




226

Acuerdos
*Más 3 acuerdos
desestimados




182

Ejecutados

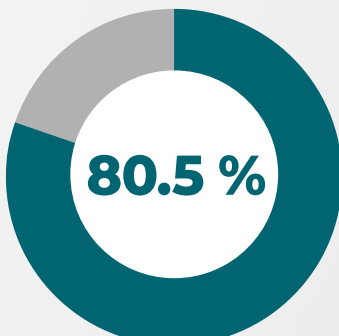

Avance de cumplimientos de acuerdos


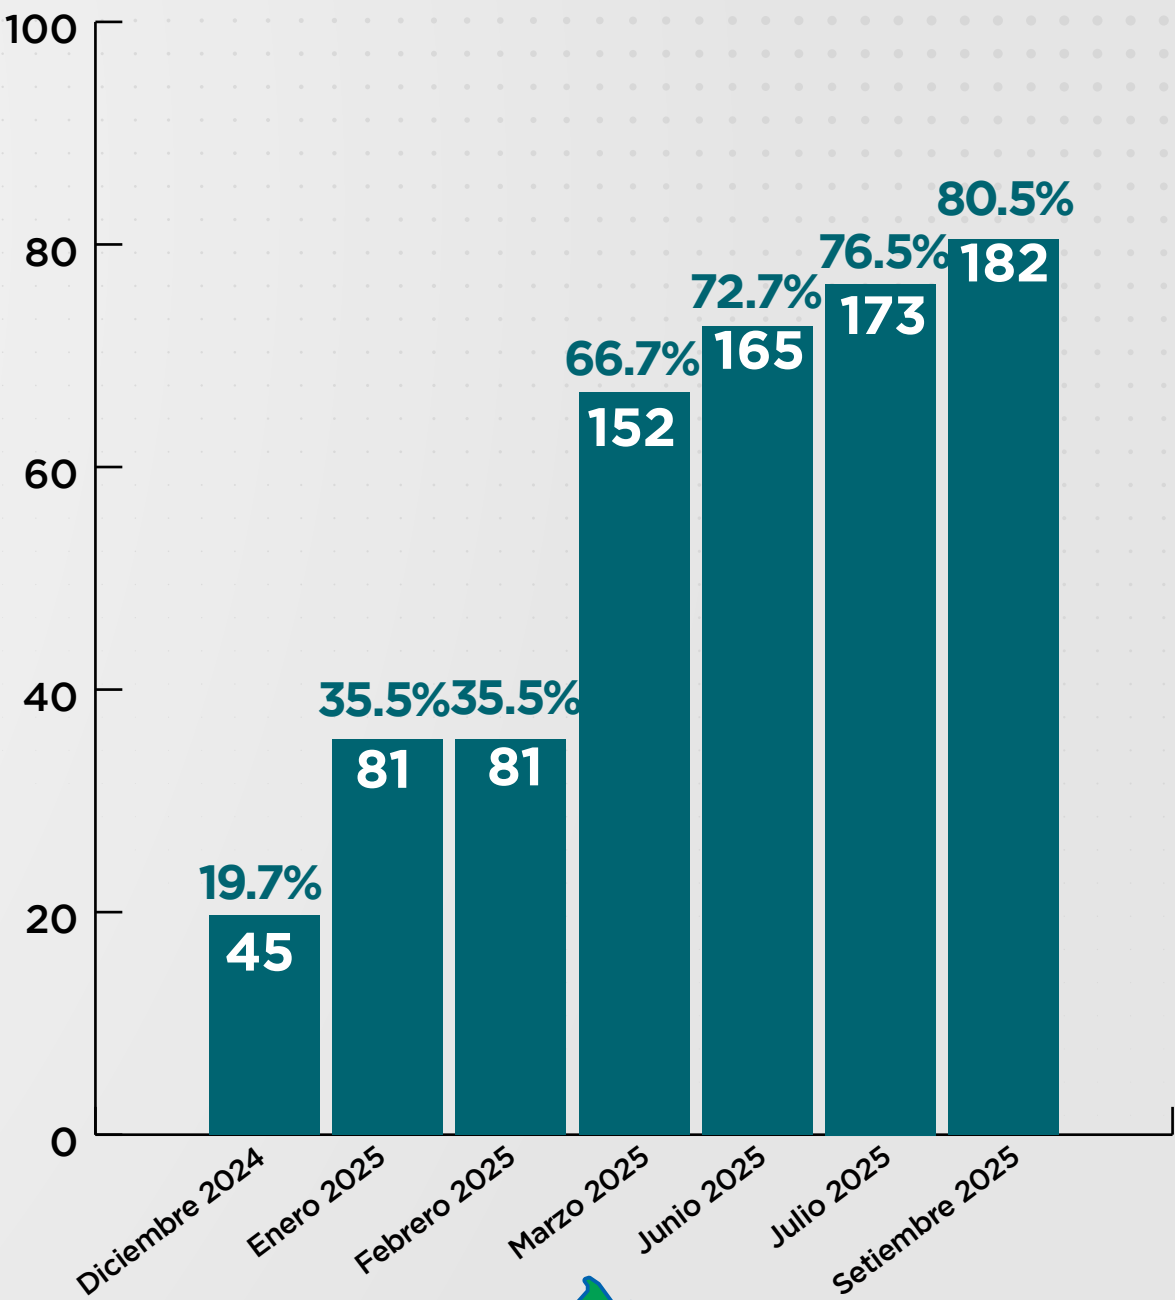


Fecha de corte: 30 de setiembre de 2025

Nota: Se desestima un acuerdo luego de una reunión de trabajo y consenso entre el gobierno nacional y gobierno regional.


Acuerdos por sectores

	 N° de acuerdos	 Ejecutados	 Porcentaje
MIMP	16	16	100 %
MINCETUR	9	9	100 %
MINCUL	3	3	100 %
MININTER	7	7	100 %
MVCS	22	21	95.5 %
MINEDU	18	17	94.4 %
PRODUCE	15	14	93.3 %
MEF	11	10	90.9 %
MTC	38	29	76.3 %
MIDAGRI	19	14	73.7 %
MINSA	48	34	70.8 %
PCM	11	6	54.5 %
MINJUSDH	3	1	33.3 %
MINDEF	4	1	25.0 %
MTPE	2	-	-
TOTAL	226	182	80.5 %

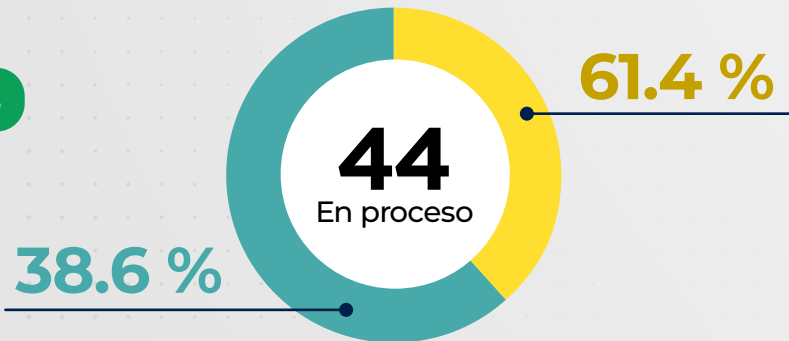


Fecha de corte: 30 de setiembre de 2025

Por entidad responsable

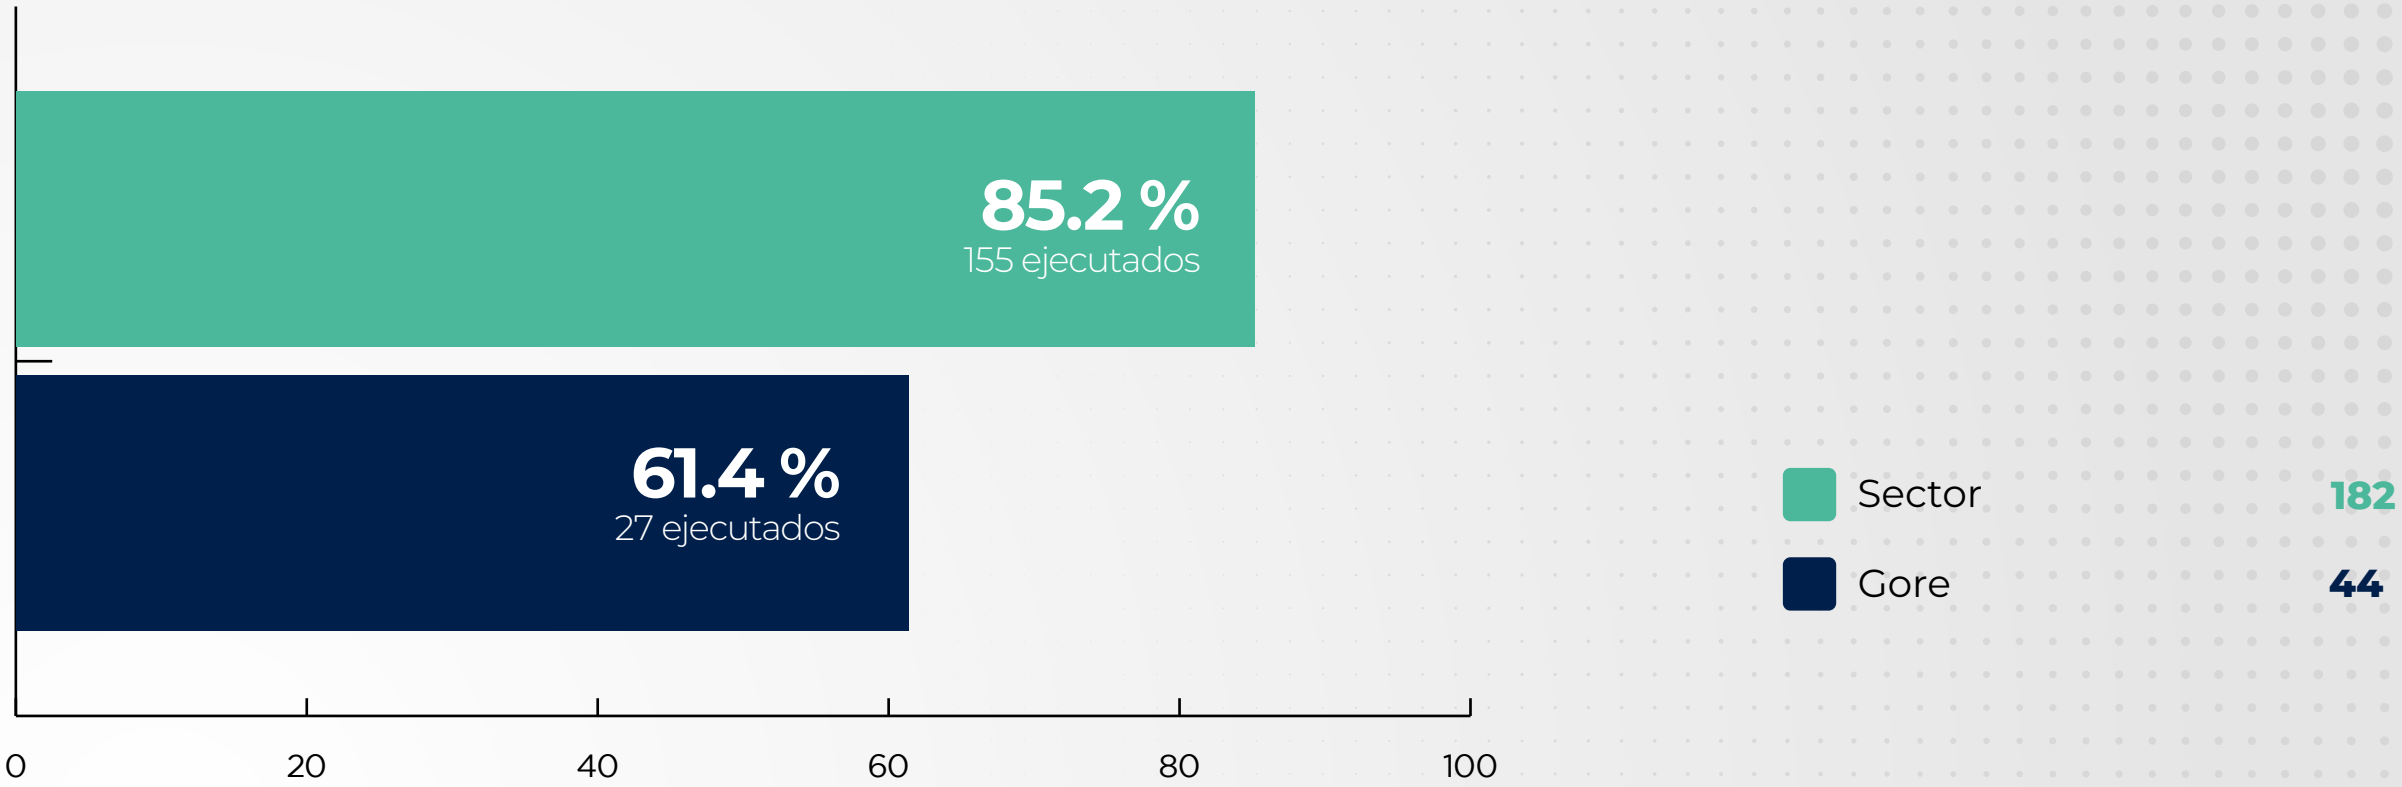


Por tipo de acuerdo




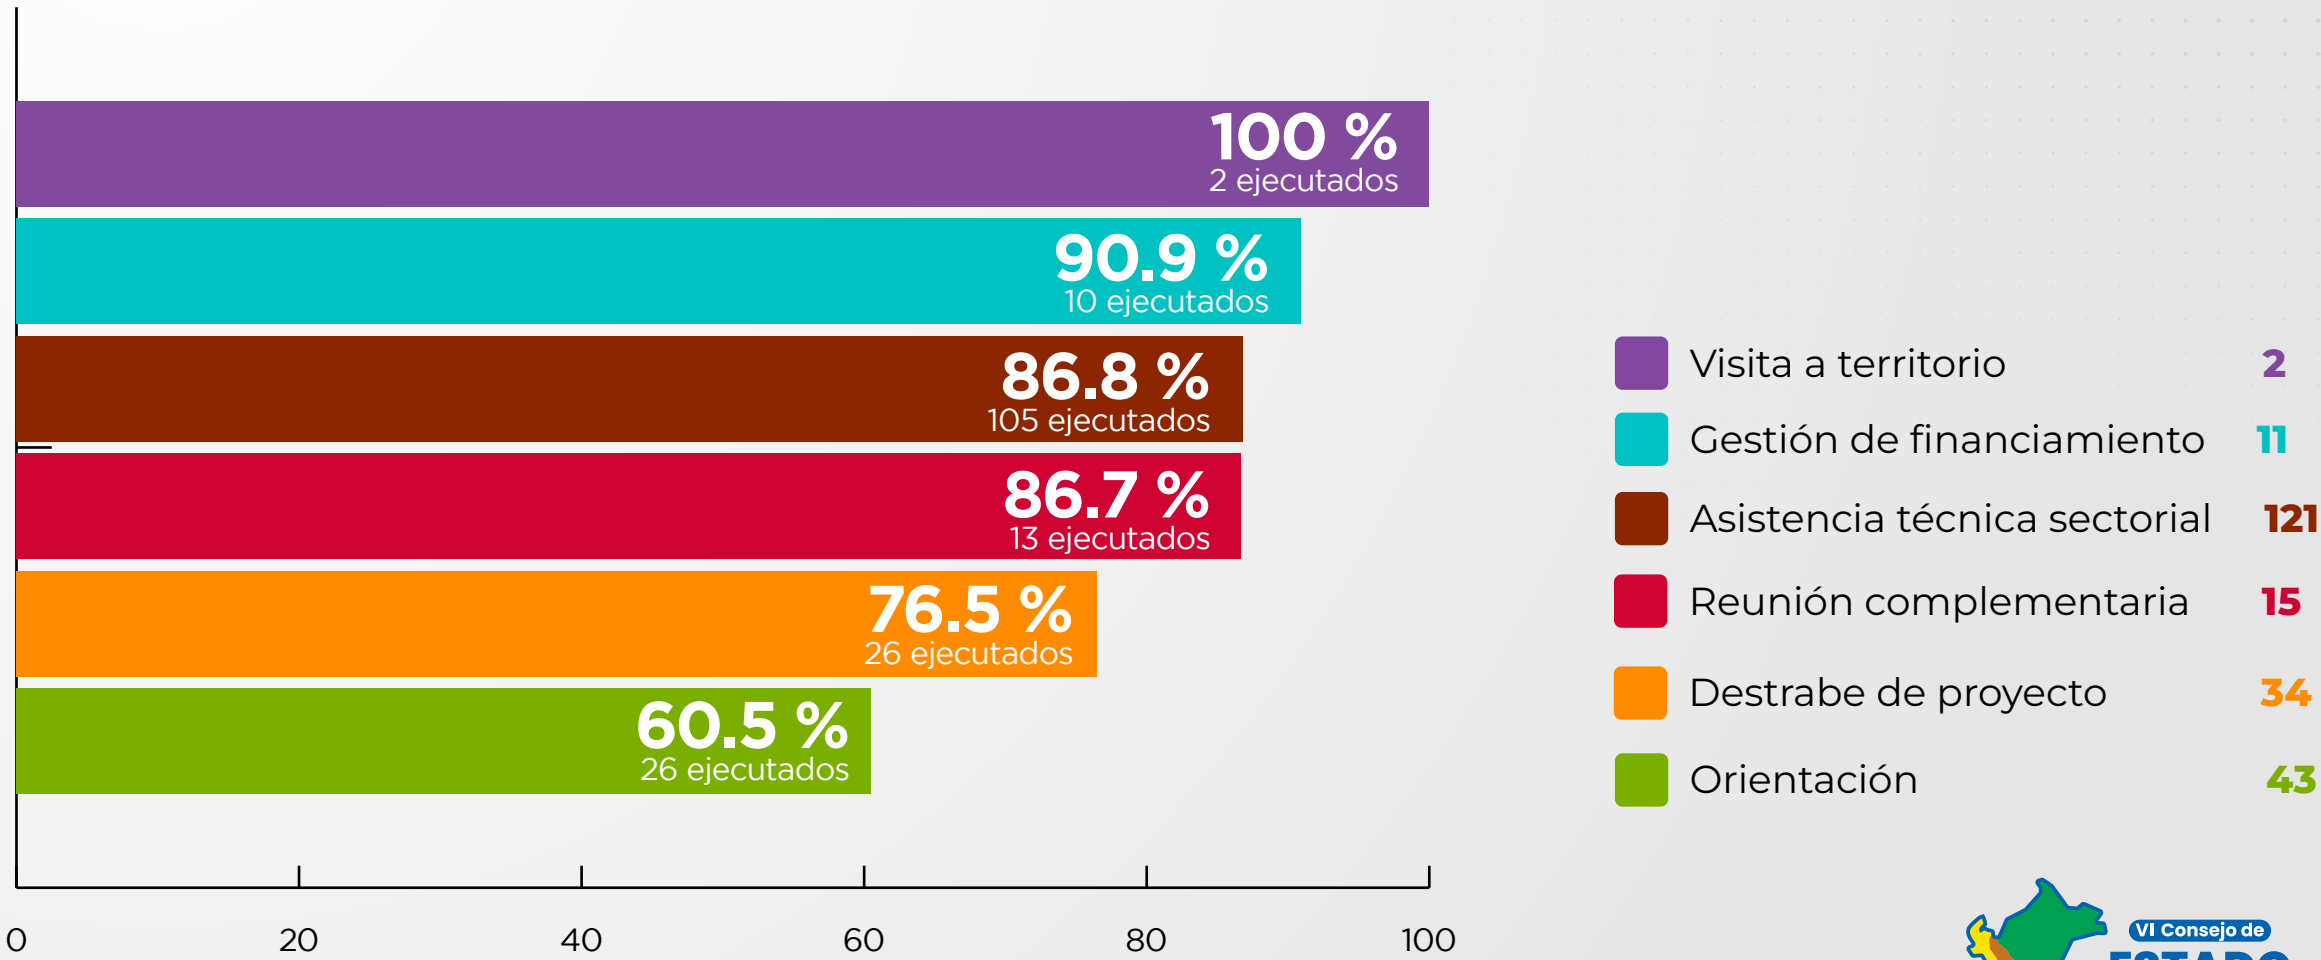


Seguimiento a los acuerdos principales y complementarios





100 % de avance, 1 región

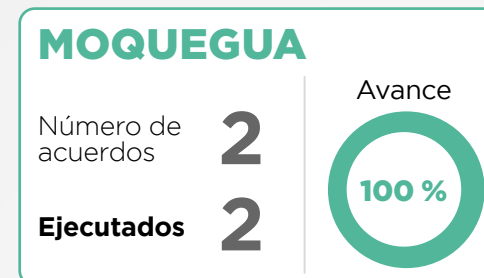

Entre 80 % y menos de 99 % de avance, 10 regiones

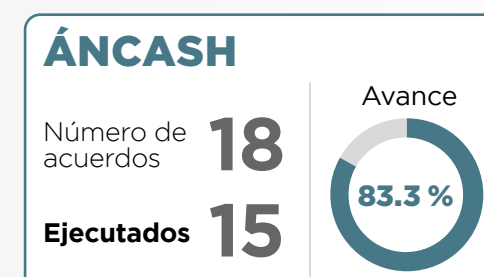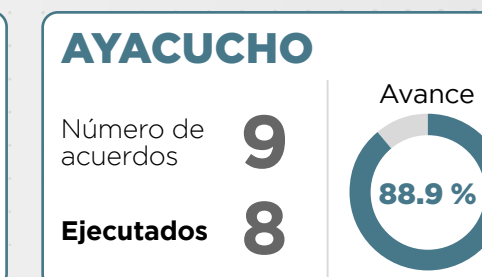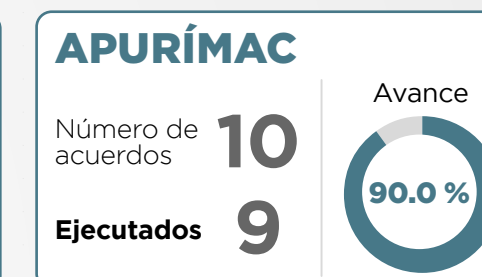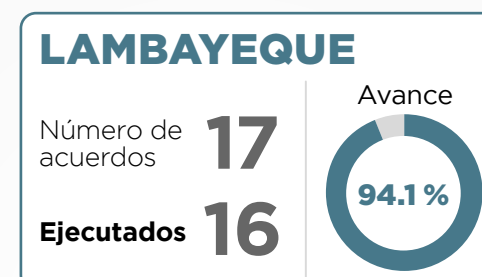

Entre 60 % y menos de 69 % de avance, 08 regiones

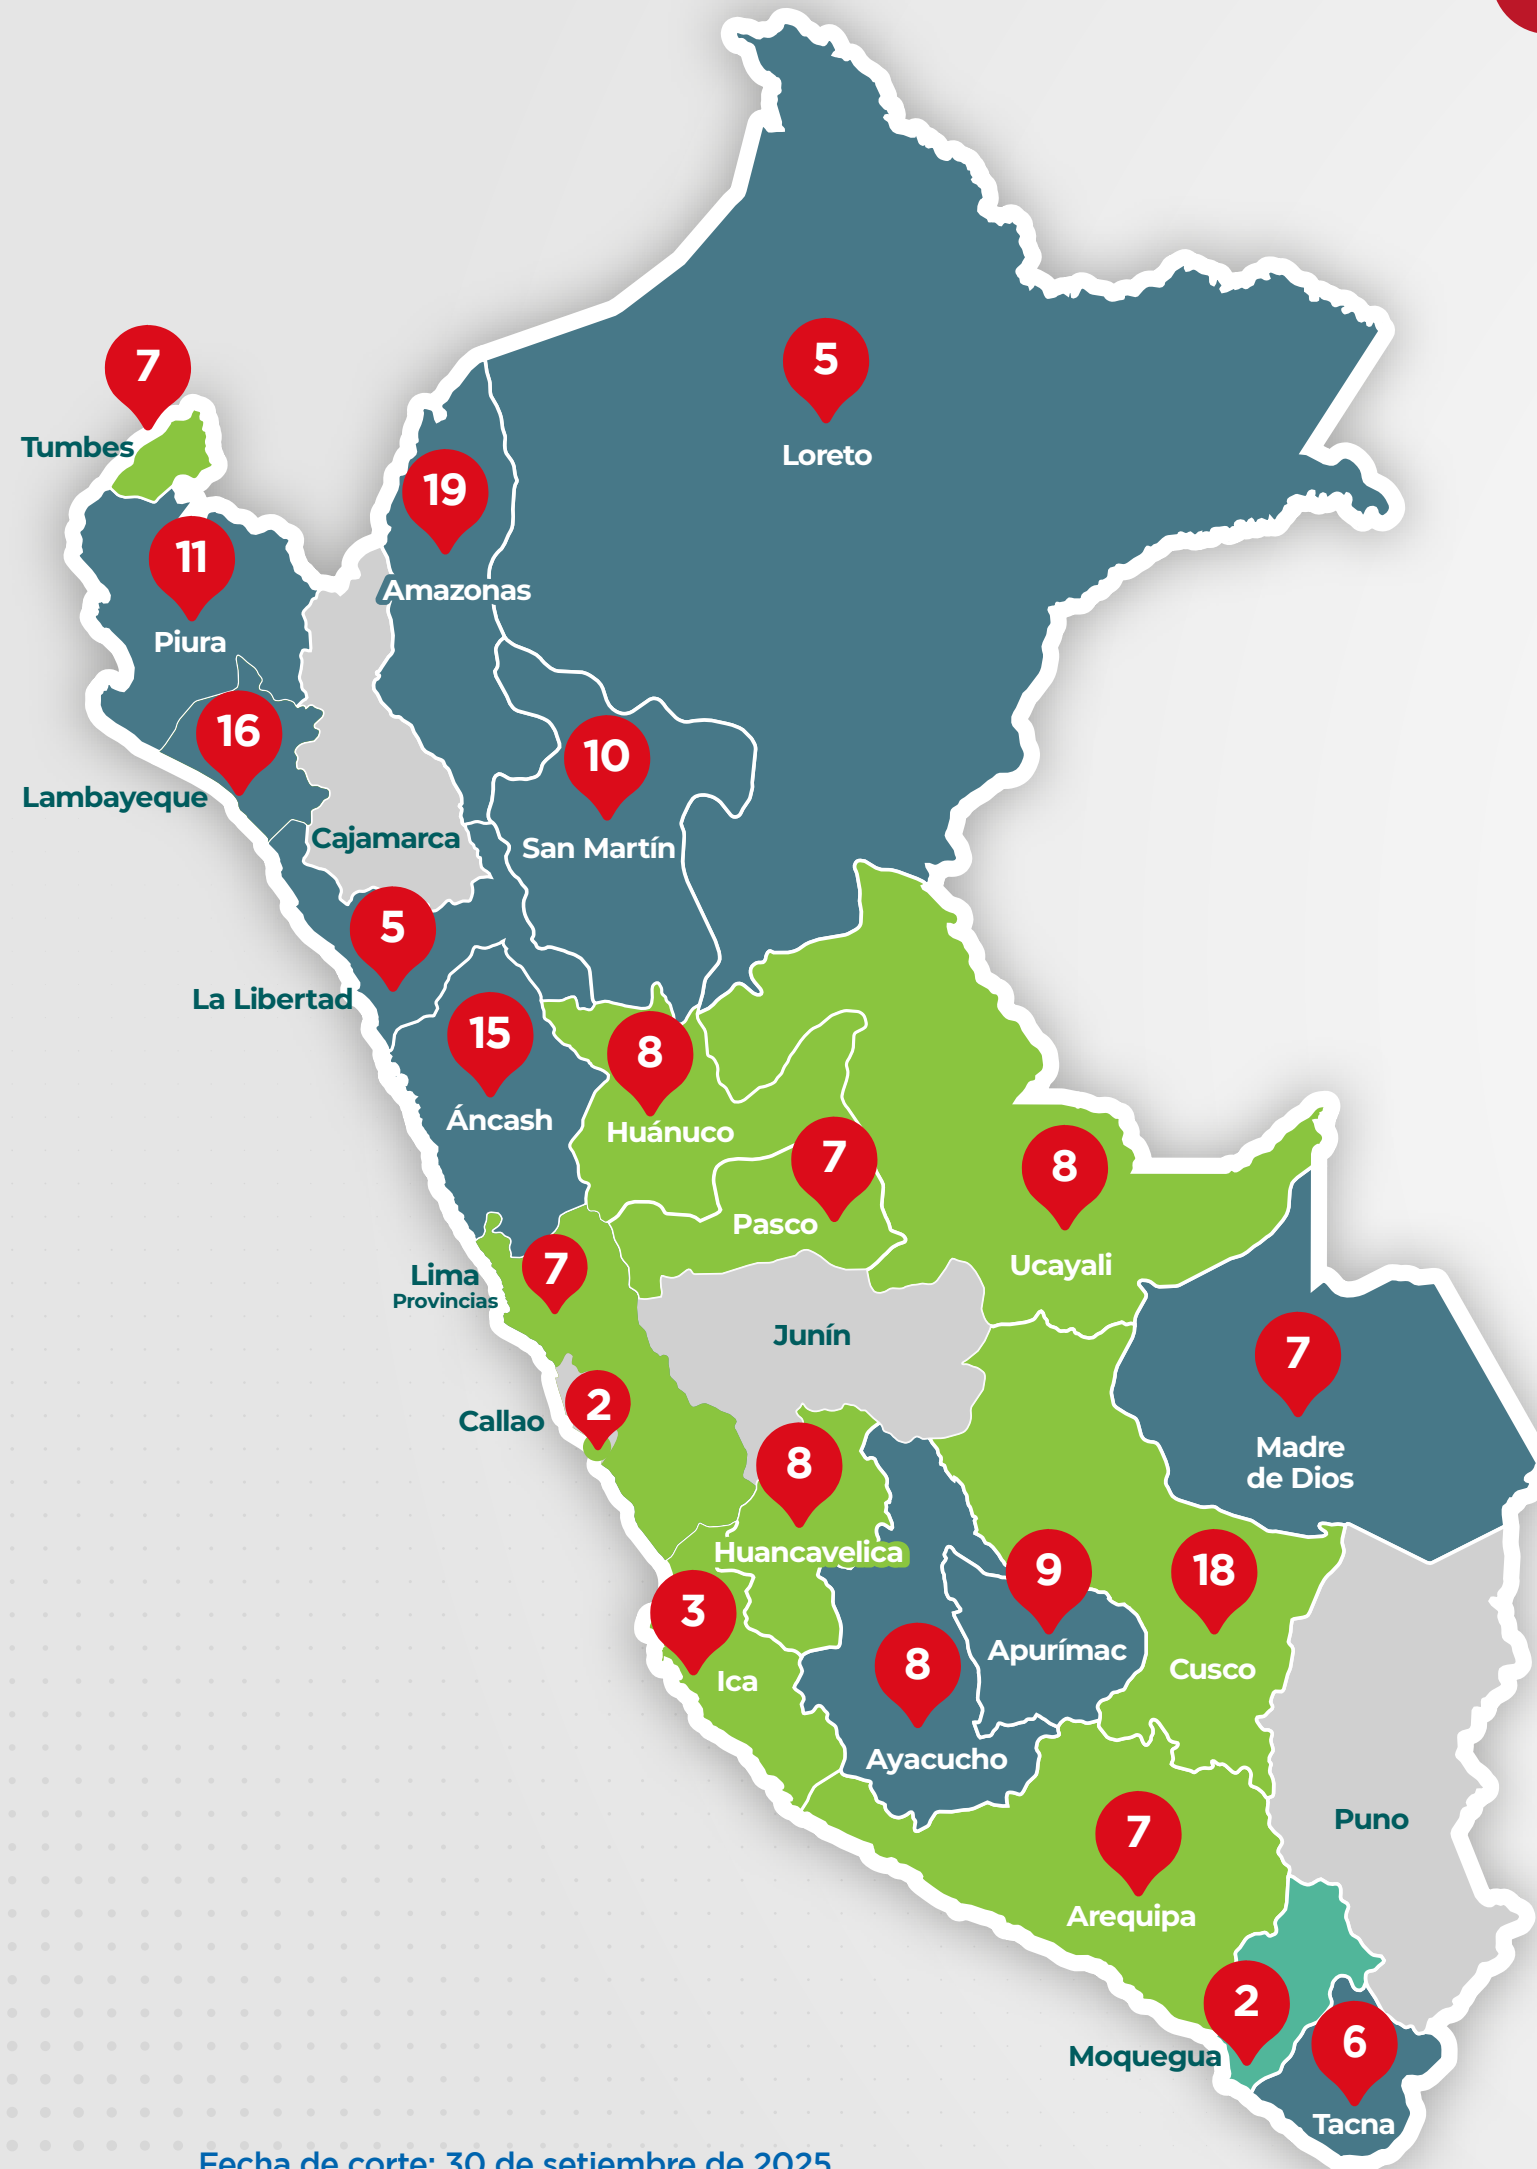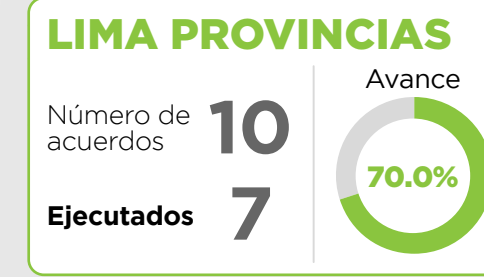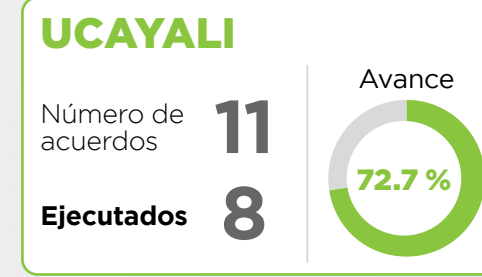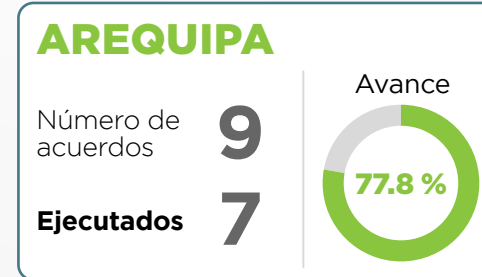

Fecha de corte: 30 de setiembre de 2025

Seguimiento a los 8 compromisos



Ejecutado

Sector responsable: GORE PIURA | Plazo: 2025

Compromiso:

Seguimiento de la formulación y ejecución del proyecto de inversión para la mejora del Estadio Miguel Grau en el distrito de Castilla, que incluye la remodelación del campo menor, el campo deportivo y servicios asociados

Avance reportado:

El 27 de junio 2025 se dió el otorgamiento de la Buena Pro por el comité de selección, de acuerdo a la admisión, calificación y evaluación de ofertas del proceso de selección CP-SM-6-2025-GRP-GRI-CS-CP-1, para la Supervisión de la Ejecución de obra al postor CONSORCIO DEPORTIVO PIURA (MOTLIMA CONSULTORES SA Y CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA), por un monto ofertado de S/ 7,780,000.00.

La obra inició el 12 de julio 2025 según portal de INFOBRAS. CUI: 2651558.



Ejecutado

Sector responsable: MIDAGRI | Plazo: 2025

Compromiso:

Ejecución de grandes proyectos de irrigación - Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura

Avance reportado:

05/06/2025: Se emitió el informe con la Lista de Corta, que incluyó a los 8 Estados que presentaron su expresión de interés, a través de RREE, hasta el 30/05/25.

11/06/2025: A través de RREE se remitió a los 8 Estados de la Lista Corta, el Alcance Preliminar con los requerimientos para la presentación de las propuestas técnicas no vinculantes, y el Itinerario para la Visita Técnica de Campo.

Se viene coordinando el desarrollo de las siguientes actividades programadas, dirigidas a los representantes de los referidos Estados: (1) Viernes 27/06/2025 - Exposición de las actividades y detalles de la Visita Técnica de Campo; y, (2) Lunes 30/06/2025 a Sábado 05/07/2025 - Visita Técnica de Campo.



Ejecutado

Sector responsable: MTC | Plazo: 2025

Compromiso:

Otorgamiento de la buena pro para la construcción de 11 puentes en la Red Vial Nacional Tambo Grande, Chulucanas - Morropón

Avance reportado:

11/03/25: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Provias Nacional (PVN), firmó los contratos n.º 019, 020, 021, 022-2025-MTC/20.2 de ejecución del proyecto "11 puentes en la ruta PE-1NR, tramo Tambo grande – Morropón – Chulucanas, departamento de Piura". Se registra una avance a septiembre del 11.1%.



Ejecutado

Sector responsable: MIDAGRI | Plazo: 2025

Compromiso:

Destrabe de los proyectos emblemáticos a favor del pequeño productor agrario - proyecto Iruro-Arequipa

Avance reportado:

Actualmente, se encuentra en ejecución de obra Según la Valorización n.º 4, correspondiente al mes de agosto (en revisión por el supervisor), se tiene un avance físico de obra de 5.68%

23.05.25, se inició la ejecución física de obra.

- La valorización Nro. 01 es de S/. 148,003.82 (pagado)
- La Valorización Nro. 02, es de S/ 1,120,660 (pagado)
- La valorización Nro. 03 es de S/. 3,598,076 (pagado)
- La valorización Nro. 04 es de S/. 4,427,230 (para trámite de pago)



Ejecutado

Sector responsable: MTC | Plazo: 2025

Compromiso:

Inicio de la construcción del puente de 550 mts. Carrasquillo-Piura

Avance reportado:

- 18/10/2024: Se firmó el convenio entre el MTC y SIMA PERÚ, para la construcción del puente de 550 m de longitud.
- 09/06/2025: Se reinició la ejecución de obra, se estima culminar para enero de 2028.
- Se registra un avance físico acumulado de 36.7% y financiero de 37.5% a septiembre.

Seguimiento a los 8 compromisos



Ejecutado

Sector responsable: MIMP | Plazo: 2025

Compromiso: Establecimiento del club “Formándose para la vida” y el módulo: “Acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia”

Avance reportado: El compromiso de implementar los clubes “Formándose para la vida” y el servicio “Mujeres acompañando mujeres” viene cumpliéndose a nivel nacional.

Actualmente existen 81 clubes en 24 departamentos (excepto Tumbes), donde se capacitaron 2,066 adolescentes y jóvenes mujeres en actividades educativas, recreativas, de sensibilización comunitaria y apoyo para el emprendimiento e inserción laboral (enero-julio 2025).

Por otro lado, el servicio “Mujeres acompañando mujeres” brinda acompañamiento a 514 mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja con riesgo leve o moderado, a través de mentoras voluntarias que articulan acciones con la comunidad. Esta intervención está presente en todos los departamentos del país (enero-julio 2025).



Ejecutado

Sector responsable: MINSA | Plazo: 2025

Compromiso: Reinicio de la ejecución del saldo de obra del “Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica

Avance reportado: Con fecha 21/02/2025 se suscribió el contrato para la ejecución de saldo de obra del hospital regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica.

Monto actualizado de la inversión S/ 514.91 millones
El día 03/03/2025 se realizó la entrega de terreno.

Reinicio de la ejecución del saldo de obra desde el 03/04/2025, a cargo del Consorcio Zacarias Correa
Avance físico acumulado ejecutado a septiembre 2025 es de 44.28%.



En proceso

Sector responsable: MTC | Plazo: 2025

Compromiso: Trabajo conjunto con la empresa privada para la próxima habilitación de vuelos instrumentales en el aeropuerto de Chachapoyas (Amazonas)

Avance reportado:
16/12/24: Mediante Oficio n.º 1066-2024-MTC/12.08, la DGAC ha cumplido con solicitar a ATSA el inicio del proceso de certificación y validación de las capacidades técnicas de sus aeronaves en los procedimientos para la ruta Lima –Chachapoyas. Al respecto, la DGAC reiterará pedido a ATSA para la tercera semana de abril

CONCLUSIONES

Se realizó el seguimiento y monitoreo de los avances del **CER VI al 30 de setiembre de 2025**, en coordinación con los ministerios y gobiernos regionales, teniéndose las siguientes conclusiones:



Se ha ejecutado **siete (07) de ocho (08) compromisos** asumidos en el VI Consejo de Estado Regional que representa el **87.5%**.



Se ha cumplido **182 acuerdos** de 226, representado el **80.5%** de acuerdos asumidos. Siendo **MIMP, MINCETUR, MINCUL y MININTER** el sector que ha ejecutado el **100% de los acuerdos**, seguido de **MVCS (95.5%), MINEDU (94.4%), PRODUCE (93.3%), MEF (90.9%), MTC (76.3%), MIDAGRI (73.7%), MINSA (70.8%), PCM (54.5 %), MINCUL (66.7%), MINJUSDH (33.3%), MINDEF (25%) y MTPE** que aun no registra avances.



El departamento de **Moquegua** tiene un avance de sus acuerdos de **100%**, los departamentos de **Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín**, tienen un avance en la ejecución de sus acuerdo entre el **80%** y **99%**.



Los departamentos de **Arequipa, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima Provincias, Pasco, Tumbes y Ucayali**, tienen un avance en la ejecución de sus acuerdos menor al **80%**.

El cumplimiento de acuerdos del VI CER, ha contribuido a:



Entrega del plan de trabajo para el cultivo de la tilapia en el departamento de Amazonas por parte de la Dirección General de Acuicultura de PRODUCE.

Al 31/12/24, mediante Oficio N° 00000909-2024-PRODUCE/DGA a Dirección General de Acuicultura de PRODUCE, **remitió Plan de Negocios para el cultivo de la tilapia en el departamento de Amazonas.**



Inicio de ejecución de obra (16.01.25) del Puente Carrasquillo – Piura (CUI: 2389634),

Con una inversión de 447.3 millones de soles. PIM 2025 109.4 millones de soles. **18/10/2024 se firmó el convenio entre el MTC y SIMA PERÚ, para la construcción del puente de 550 m de longitud. 09/06/2025: Se reinició la ejecución de obra, se estima culminar para enero de 2028.**

RECOMENDACIONES



La Secretaría de Descentralización socializará el esquema y los resultados del seguimiento y monitoreo de los acuerdos del Consejo de Estado Regional a los territorios.



Los **gobiernos regionales** deberán designar de manera permanente un punto focal para articular el seguimiento.



Realizar **reuniones de seguimiento permanente** con el punto focal de los GOREs y equipo técnico de los sectores. La Secretaría de Descentralización propiciará el destrabe y cumplimiento de compromisos y acuerdos.



Difundir los resultados del seguimiento y monitoreo de los compromisos y acuerdos del Consejo de Estado Regional.



Realizar seguimiento a la cartera priorizada en el Consejo de Estado Regional, en coordinación con los sectores y gobiernos regionales.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MINSA




Reinicio de la ejecución del saldo de obra del “Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica
CUI: 2354781

N° de Acuerdo - CER IV-0035

Con fecha 20/12/24 se suscribió el convenio de administración de recursos mediante R.M. n.º 892-2024/MINSA. Con fecha 21/02/25 se suscribió el contrato para la ejecución de saldo del saldo de obra. El día 03/03/25 se realizó la entrega de terreno.

Al 13/08/25 se declara un avance de ejecución física acumulado de 44.28% (- 1er Contrato obra: 43.24% - 2do Contrato saldo de obra: 1.84%).



Unidad Ejecutora: PRONIS - MINSA


Fecha de corte: 30 de setiembre de 2025



Continuidad de ejecución de obra del Hospital de Apoyo de Puquio “Felipe Huamán Poma de Ayala”, distrito de Puquio - provincia de Lucanas - departamento de Ayacucho -CUI: 2194681

N° de Acuerdo - CER VI-00107

Al 16/06/25 se ejecuta la Contingencia por administración directa, la que tiene un Avance físico acumulado Principal Ejecutado: 16.08%. Obra de contingencia con avance de 84%.



Unidad Ejecutora: GORE Ayacucho

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES




MINSA



Reinicio de ejecución de obra:
Mejoramiento de los servicios de salud
en el establecimiento de salud de
Uchiza Nivel I-4, distrito de Uchiza,
provincia de Tocache, departamento de
San Martín - CUI: 2377763

Nº de Acuerdo - CER VI - 00292

Reinicio de ejecución de obra con fecha 19/05/25. A septiembre cuenta con un 43.9% de avance de la ejecución de inversión y 41.5 % de avance financiero.



Unidad ejecutora: GORE San Martin

Fecha de corte: 30 de setiembre de 2025



MINCETUR




Buena Pro para la ejecución de obra del
proyecto: Instalación de servicios turísticos de
observación, descanso y acceso en la ruta
Qhapac Ñan Molino - Tambo Inca, distritos de
Chachapoyas y levanto, provincia de
Chachapoyas, región Amazonas - CUI: 2229664

Nº de Acuerdo - CER VI - 00295

Con fecha 21/08/25 entro en vigencia el contrato para la ejecución del proyecto.

Con fecha 23/08/2025 se autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público 2025 a favor del GORE Amazonas, Mediante D.S. 178-2025-EF



Unidad ejecutora: GORE Amazonas - PROAMAZONAS.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES



MIDAGRI




Firma del convenio para la ejecución y puesta en marcha del proyecto alto Piura entre el GORE Piura y el Midagri. CUI: 2040186

COMPROMISO

Con fecha 12/12/24, se suscribió Convenio entre el MIDAGRI y el GORE Piura.

- El 02 de setiembre del 2025, el Comité Técnico acordó aprobar la modificación del cronograma donde se establece que el informe de cierre de indagación de mercado se realizará hasta el 18 de setiembre del 2025.
- Con fecha 18.09.2025, se remite al Comité el Informe de cierre de indagación de mercado y el proyecto de Alcance Final para la continuidad del proceso.
- Se remitió a la UGIES del PSI el Cronograma de Contratación Estado a Estado (G2G) del Proyectos Alto Piura.
- Suscripción de Contrato G2G, se efectuará aproximadamente el 23 de Marzo del 2026.



Unidad ejecutora: Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

Fecha de corte: 30 de setiembre de 2025



Firma del convenio para el afianzamiento de la cuenca hidrográfica del Río Chira y del sistema hidráulico común Chira - Piura (Sistema Poechos).

COMPROMISO

Con fecha 12/12/24, se suscribió Convenio entre el MIDAGRI y el GORE Piura para la Formulación, Elaboración y Ejecución de Inversiones con el objetivo de Desarrollar el Afianzamiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Chira y del Sistema Hidráulico Común Chira- Piura (Sistema Poechos), así como los Proyectos Necesarios y/o Complementarios para garantizar el Recurso Hídrico.

Se remitió a la UGIES del PSI el Cronograma de Contratación Estado a Estado (G2G) de los Proyectos Poechos y Alto Piura actualizado a la fecha, donde se indica que la Firma del Contrato G2G - Etapa: Suscripción de Contrato G2G, se efectuará aproximadamente el 23 de Marzo del 2026.

PRINCIPALES LOGROS SECTORIALES




MINCUL



Inicio de ejecución de obra para la construcción y equipamiento del centro cultural, de la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas.
CUI: 2234031

Nº de Acuerdo - CER VI-0296

La obra inició el 28/08/2025. A septiembre cuenta con un 0.7% de avance de la ejecución de inversión y 0.7 % de avance financiero.



Unidad ejecutora: GORE Amazonas
